

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



RELATÓRIO PLANO DE OBRAS
SETEMBRO/2023

O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura.

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DPCE e verificando os respectivos protocolos, apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 30/10/2023.

Observações:

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos:
 - a. Todo dado indicado de % *financeiro executado* refere-se ao desempenho financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF, Departamento Econômico Financeiro.
 - b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário macro, onde não houver dados ou relatórios de medição de obra ou serviço referentes ao desempenho físico, está-se considerando desempenho financeiro consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo.
2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada
 - a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
 - b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO.

1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 7 OBRAS

1	LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL	EM OBRA BLOCO CRIMINAL	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 63.955.098,48	ATRASADO
	Emissão OES	março, 2020	
	Data prevista conclusão	junho, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	39	
	Prazo decorrido de execução (meses)	43	
	% fisico realizado	54,90%	
	Medição realizada	14ª / 20	
	Financeiro realizado	R\$ 35.114.193,77	
	Saldo a pagar	R\$ 28.840.904,71	
	Termo de Recebimento		

2	AMPÉRE - PADRÃO 1800	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 6.610.937,15	ATRASADO
	Emissão OES	outubro, 2019	
	Data prevista conclusão	junho, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	31	
	Prazo decorrido de execução (meses)	48	
	% fisico realizado	41,83%	
	Medição realizada	11ª / 14	
	Financeiro realizado	R\$ 2.765.637,88	
	Saldo a pagar	R\$ 3.845.299,27	
	Termo de Recebimento		

3	FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 45.199.004,14	ATRASADO
	Emissão OES	outubro, 2020	
	Data prevista conclusão	abril, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	29	
	Prazo decorrido de execução (meses)	36	
	% fisico realizado	80,09%	
	Medição realizada	14ª / 18	
	Financeiro realizado	R\$ 36.202.017,01	
	Saldo a pagar	R\$ 8.996.987,13	
	Termo de Recebimento		

4	CORBÉLIA - PADRÃO 1500	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 9.394.656,50	ATRASADO
	Emissão OES	novembro, 2021	


Data prevista conclusão	janeiro, 2023
Prazo previsto execução (meses)	13
Prazo decorrido de execução (meses)	22
% físico realizado	17,35%
Medição realizada	4ª / 13
Financeiro realizado	R\$ 1.629.827,06
Saldo a pagar	R\$ 7.764.829,44
Termo de Recebimento	

5	NOVA AURORA - PADRÃO 1500	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 10.382.432,41	ATRASADO
	Emissão OES	agosto, 2022	
	Data prevista conclusão	agosto, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	14	
	% físico realizado	36,70%	
	Medição realizada	6ª / 12	
	Financeiro realizado	R\$ 3.810.222,83	
	Saldo a pagar	R\$ 6.572.209,58	
	Termo de Recebimento		

6	TERRA RICA - PADRÃO 1500	EM OBRA NOVO FÓRUM	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 11.198.000,00	ALERTA
	Emissão OES	outubro, 2022	
	Data prevista conclusão	outubro, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	12	
	% físico realizado	41,81%	
	Medição realizada	6ª / 12	
	Financeiro realizado	R\$ 4.681.604,54	
	Saldo a pagar	R\$ 6.516.395,46	
	Termo de Recebimento		

7	CAMPO MOURÃO	EM OBRA USINA FOTOVOLTAICA	STATUS
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 30.779.582,30	ALERTA
	Emissão OES	maio, 2023	
	Data prevista conclusão	fevereiro, 2024	
	Prazo previsto execução (meses)	9	
	Prazo decorrido de execução (meses)	5	
	% físico realizado	0,00%	
	Medição realizada	0 / 9	
	Financeiro realizado	R\$ 0,00	
	Saldo a pagar	R\$ 30.779.582,30	
	Termo de Recebimento		

Análise de desempenho anual de desembolsos com obras em andamento:

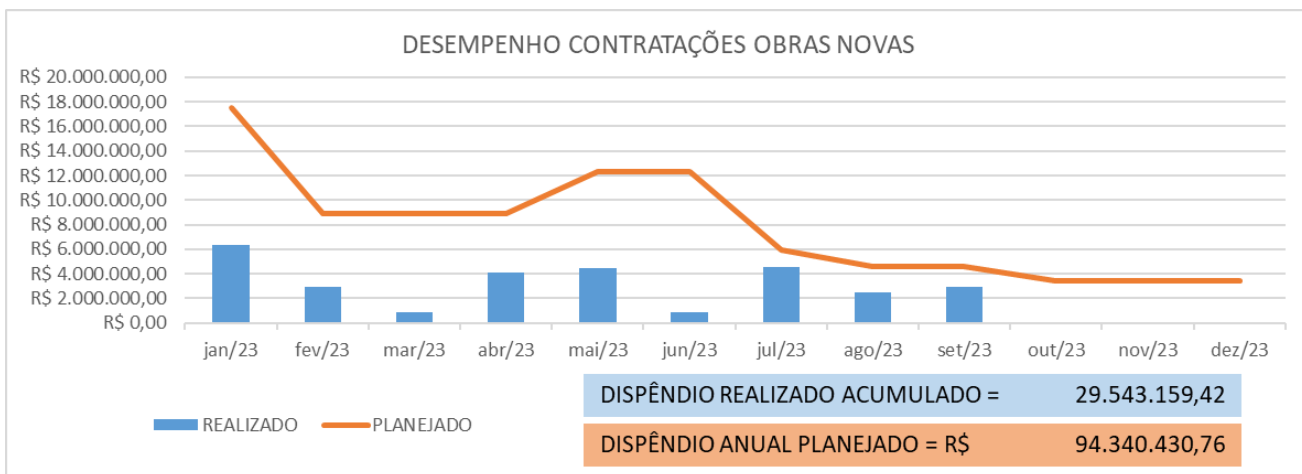

1.2 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 18 OBRAS

1	COLORADO - PADRÃO 1500	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

2	JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1500	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

3	LOANDA - PADRÃO 1500	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

4	MARIALVA - PADRÃO 1500	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

5	PRUDENTÓPOLIS	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023

Fase atual	Em licitação
------------	--------------

6	QUEDAS DO IGUAÇU - PADRÃO 1500	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

7	SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1500	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

8	IPORÃ - PADRÃO 650 PLUS	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

9	PEABIRU - PADRÃO 650 PLUS	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

10	PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 650 PLUS	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

11	BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 650	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

12	CARLÓPOLIS - PADRÃO 650	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

13	CENTENÁRIO DO SUL - PADRÃO 650	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

14	JOAQUIM TÁVORA - PADRÃO 650	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso

Início da licitação	junho, 2023
Fase atual	Em licitação

15	MANGUEIRINHA - PADRÃO 650	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

16	RIBEIRÃO DO PINHAL - PADRÃO 650	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

17	SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 650	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

18	URAI - PADRÃO 650	CONSTRUÇÃO FÓRUM NOVO
	Valor máximo estimado licitação	sigiloso
	Início da licitação	junho, 2023
	Fase atual	Em licitação

1.3. PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 7 PROJETOS

1	CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 4.981.060,31	ATRASADO
	Contratado	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES	junho, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	56	
	Prazo decorrido de execução (meses)	64	
	% financeiro realizado consolidado	25,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 3.735.795,24	

2	COLOMBO - PROJETOS	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 457.187,55	ATRASADO
	Contratado	SOBE SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME	
	Emissão OES	dezembro, 2019	
	Prazo previsto execução (meses)	36	
	Prazo decorrido de execução (meses)	46	
	% financeiro realizado consolidado	58,79%	
	Saldo a pagar	R\$ 188.408,65	

3	PONTA GROSSA - PROJETOS	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 784.739,75	ATRASADO
	Contratado	ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES (reinício de contrato)	outubro, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	26	
	Prazo decorrido de execução (meses)	36	
	% financeiro realizado consolidado	54,75%	
	Saldo a pagar	R\$ 355.132,89	


4	3 FORUNS P10000 - CAMPO MOURÃO, PARANAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 447.447,00	ATRASADO
	Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME	
	Emissão OES (reinício de contrato)	julho, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	7	
	Prazo decorrido de execução (meses)	39	
	% financeiro realizado consolidado	24,70%	
	Saldo a pagar	R\$ 336.927,59	

5	10 FÓRUNS P1500 - NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO SUL, PONTAL DO PARANÁ, TERRA RICA, PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MANGUEIRINHA, WENCEWSLAU BRAZ	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 397.624,71	ATRASADO
	Contratado	JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME	
	Emissão OES (reinício de contrato)	fevereiro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	32	
	% financeiro realizado consolidado	61,10%	
	Saldo a pagar	R\$ 154.689,50	

6	7 FÓRUNS - JANDAIA DO SUL, PRUDENTÓPOLIS, QUEDAS DO IGUAÇU, LOANDA, MARIALVA, SÃO MATEUS DO SUL, COLORADO	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 208.999,00	ATRASADO
	Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME	
	Emissão OES (reinício de contrato)	julho, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	12	
	Prazo decorrido de execução (meses)	27	
	% financeiro realizado consolidado	58,28%	
	Saldo a pagar	R\$ 87.199,20	

7	CURITIBA - SEDE MAUÁ (USINA FOTOVOLTAICA)	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	STATUS
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 23.485,00	ATRASADO
	Contratado	ELETROGANS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
	Emissão OES (reinício de contrato)	fevereiro, 2023	
	Prazo previsto execução (meses)	2	
	Prazo decorrido de execução (meses)	7	
	% financeiro realizado consolidado	0,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 23.485,00	STATUS

Análise de desempenho anual de desembolsos com projetos complementares:

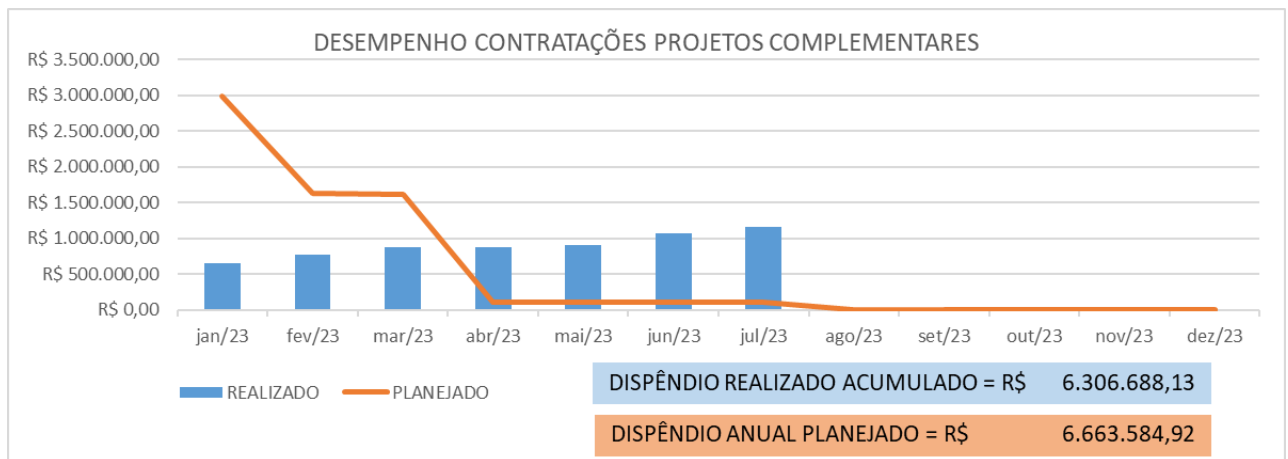

1.4. PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: **0 PROJETOS**

1.5. ESTUDOS DE VIABILIDADE DEA: X ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

No período, foram elaborados **6 estudos técnicos preliminares**, para as Comarcas de Cascavel, 2x Curitiba, Faxinal, Iretama e Clevelândia.

1.6. TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: **13 TERRENOS**


Conforme evidenciado na planilha de controle abaixo, não houve no mês do relatório alteração de significativa de *status* nas aquisições de imóveis da classe patrimonial terreno em curso.

Nº	COMARCA	STATUS	Protocolo		Área e situação de Terreno
1	ALTO PARANÁ	TERRENO OFERTADO CONSIDERADO INADEQUADO AGUARDA POSICIONAMENTO DA COMARCA	0044842-67.2015	7159920	4.393,37 m ² (terreno proposto)
2	MORRETES	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0065613-61.2018	7649592	8.447,84 m ² (terreno eleito)
3	PIRAÍ DO SUL	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0065866-15.2019	7158450	5.000,00 m ² (terreno proposto)
4	CÂNDIDO DE ABREU	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA	0017074-64.2018	8188927	6.052,54 m ² (terreno proposto)
5	PARANAGUÁ	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0083854-54.2016	9160960	14.903,07 m ² (terreno eleito)
6	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	TERRENO ELEITO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	0055920-19.2019	9668267	6.910,83 m ² (terreno proposto)
7	CAPANEMA	MUNICÍPIO DECIDIU DAR OUTRA DESTINAÇÃO AO TERRENO	0026468-61.2019	9258151	6.712,99 m ² (terreno proposto)
8	SENGÉS	EM ANÁLISE NOVO TERRENO	0095784-64.2019	9184841	4.240,4 m ² (terreno doado) Novo terreno ofertado 4.820,68 m ²
9	SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ	EM ANÁLISE TERRENOS	0061298-53.2019	9393208	5.000,00 m ² (terreno proposto)
10	PITANGA	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA	0086215-39.2019	8827848	10.000,00 m ² (terreno doado) Pedida reversão da doação Novo terreno proposto, 10.000,00 m ² (terreno proposto)
11	MEDIANEIRA	EM ANÁLISE TERRENOS	0053483-05.2019	9345164	6.880,00 m ² (terreno proposto)
12	PIRAQUARA	EM ANÁLISE TERRENOS	0080776-47.2019	9588665	5.732,87 m ² (terreno proposto) 4.617,35 m ² (Terreno do Fórum Atual)
13	JAGUAPITÃ	EM ANÁLISE TERRENOS	0075981-27.2021	9014038	Em análise de novas áreas


2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR

RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO			EMIÇÃO
QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²)			19/10/2023
ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca)			907
NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)			723
	Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio		103
	Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio		59
	Idade média das construções (anos)		27,0
ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIB)			323.296,67
ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO (fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses) (não inclui imóveis cedidos a 3º)			34.602,51
ÁREA TOTAL DE IMÓVEIS EM OUTROS USOS NÃO JUDICIÁRIOS OU SEM USO (cedidos a 3º e/ou sem uso)			34.367,38
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS (não inclui outras áreas cedidas a 3º, como casas de magistrados e outros imóveis de uso não judiciários)			392.266,56
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA (uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos)			193.034,93
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR			585.301,49
ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS			643.277,41
ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS EM USO NAS COMARCAS			126.716,49
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO EM CURITIBA			197.843,75
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA			967.837,65
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS		D	45
			316.221,49
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS			14
			88.141,20
VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CONFORME SISTEMA HERMES			
VALOR PATRIMONIAL TERRENOS			R\$ 760.826.100,17
VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES			R\$ 1.093.585.423,59
VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR			R\$ 1.854.411.523,76
OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, e conforme Sistema Hermes			
NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR			
1. EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR			
		EM USO JUDICIÁRIO	SEM USO OU OUTROS USOS
FÓRUNS CENTRAIS		162	0
FÓRUNS ANTIGOS		2	46
IMÓVEIS 2		13	11
IMÓVEIS 3		8	4
IMÓVEIS 4		6	1
IMÓVEIS 5		4	0
IMÓVEIS 6		1	0
TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO INTERIOR	A	196	C
			62
obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não judiciário)			
2. EDIFICAÇÕES EM CURITIBA			
TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA		B	36
PRÓPRIOS (TJPR):		3	
PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ):		20	
LOCADOS AO TJPR:		13	
PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL):	2		
TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO		(A+B)	232
TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO)		(A+B+C)	294
TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS)		(D)	45
TOTAL GERAL DE UNIDADES		(A+B+C+D)	339

IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - PROPRIEDADE

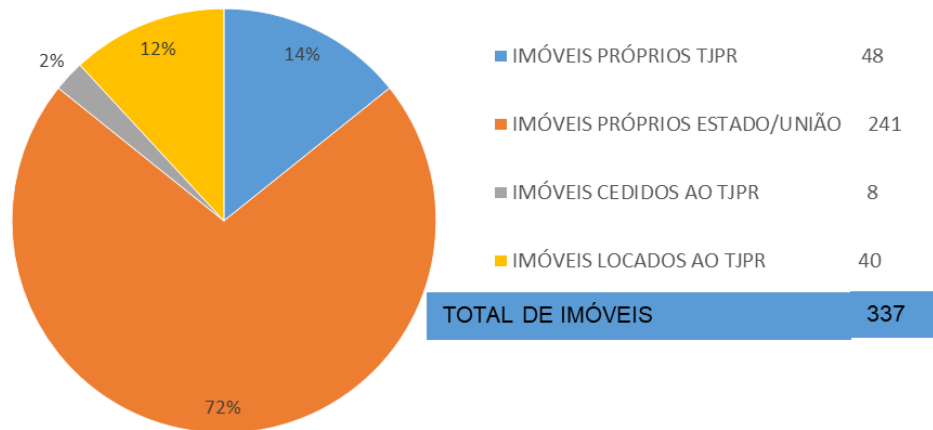

IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - USO

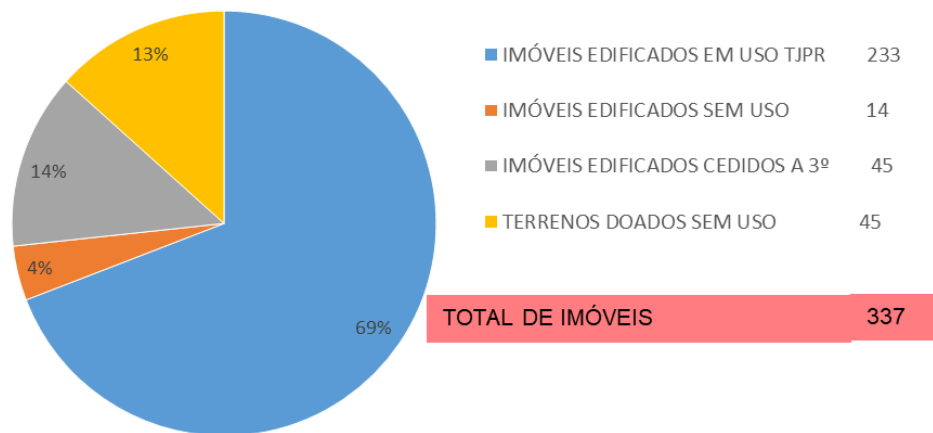

3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES)

RELATÓRIO RANQUEAMENTO DE COMARCAS RANQUEAMENTO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 114/2010 CNU										EMISSÃO 19/10/2023
POSICÃO RANQUEAMENTO	COMARCAS	NOTA REFERENCIAL	SITUAÇÃO DOMINIAL DO FÓRUM CENTRAL	HÁ OBRAS/SERVIÇO EM ANDAMENTO?	HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO?	FASE ATUAL	ÚLTIMA AÇÃO DE OBRA	ANO DA OBRA	TERRENO DOADO?	
1	NOVA AURORA	32	MUNICÍPIO	EM OBRA NOVO FÓRUM	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	COMPLEMENTARES ENTREGUES	2014-REPAROS 2016-ARCOND. 2018-SIST. SEGURANÇA	FÓRUM CENTRAL CEDIDO AO TJPR	TERRENO DOADO	
2	AMPÉRE	36	MUNICÍPIO	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA	18/1000	2019-INST. ARCOND. 2014-REPAROS 2016-REPAROS	IMÓVEL CEDIDO AO TJPR PELA PREFEITURA MUNICIPAL	TERRENO DOADO	
3	CENTENÁRIO DO SUL	50	MUNICÍPIO	NADA CONSTA	CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650	EM LICITAÇÃO	2019-INST. ARCOND. 2015-REF. ELÉTRICA 2018-INST. ARCOND. 2022-REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 985 TRD N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
4	COLOMBO	73	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO ARQUITETÔNICO P8000	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	2014-INST. ARCOND. 18/RECFTY 2017-REESTRUTURAÇÃO DO FÓRUM 2018-REPAROS CFVY	FÓRUM CENTRAL N 977 TRD 977 Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
5	QUATRO BARRAS	78	LOCADO	NADA CONSTA	NADA CONSTA	18/1000	LOCADO	FÓRUM CENTRAL LOCADO	NÃO	
6	JAGUARIVÁ	80	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P800	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	2012-REF. COBERTURA 2016-PRÉV. INCÊNDIO 2018-INST. ARCOND. 2018-REFORMA	FÓRUM CENTRAL N 985 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
7	PAÇANDU	93	LOCADO	NADA CONSTA	NADA CONSTA	18/1000	LOCADO	FÓRUM CENTRAL LOCADO	NÃO	
8	MARINGÁ	117	ESTADO DO PARANÁ	LICITAÇÃO NOVO FÓRUM 009795-68.2022 TRD 799087	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	COMPLEMENTARES CONTRATADOS RECEBIDOS TRD 799087	2016-REPAROS TERRENOS 2017-REPAROS ATA 2018-2019-INST. ARCOND. 2021-REPAROS ELET.	FÓRUM CENTRAL N 985 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
9	BOCAIÚVA DO SUL	126	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650	EM LICITAÇÃO	2016-REPAROS ELET. 2018-REPAROS ATA	FÓRUM CENTRAL N 978 TRD 978 Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	NÃO	
10	CLEVELÂNDIA	153	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650	EM LICITAÇÃO COMPLEMENTARES	2014-INST. ARCOND. 2017-REPAROS 2018-REF. ELÉTRICA 2018-REESTRUTURAÇÃO JURÍDICA	FÓRUM CENTRAL N 983 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
11	PARANGUÁ	154	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO ELETTO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	2016-REF. AMPL. 2016-REFORMA 2017-2018-REPAROS COBERT. 2018-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 976 TRD 976 Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	PROPOSTO	
12	PONTAL DO PARANÁ	156	MUNICÍPIO	EM LICITAÇÃO NOVO FÓRUM TRP 7927866	CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650 PLUS	EM LICITAÇÃO	2014-INST. ARCOND. 2014-2017-REPAROS 2021-REPAROS ATA	IMÓVEL CEDIDO AO TJPR PELA PREFEITURA MUNICIPAL	TERRENO DOADO	
13	CORBÉLIA	157	ESTADO DO PARANÁ	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA	18/1000	2014-INST. ARCOND. 2014-REF. ELÉTRICA REPAROS 2021-REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 977 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
14	IRATI	162	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO	LICITAÇÃO COMPLEMENTARES	2019-INST. ARCOND. 2016-REPAROS 2020-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 997 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
15	ALTO PARANÁ	172	ESTADO DO PARANÁ	REFORMA	ANÁLISE DE TERRENOS	TERRENO OFERTADO CONSIDERADO INADEQUADO AGUARDADA POSICIONAMENTO DA COMARCA	2016-REF. AMPL. 2016-REFORMA 2018-2019-REPAROS 2018-REF. COBERT.	FÓRUM CENTRAL N/C TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	NÃO	
16	ANTONINA	170	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	ESTUDO DE VIABILIDADE A PROGRAMAR	2019-INST. ARCOND. 2018-REPAROS 2018-INST. ARCOND. 2018-REF. AMPL.	FÓRUM CENTRAL N/C TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
17	MORRETES	174	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	TERRENO ELETTO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	2016-ARCOND. 2018-REFORMA CONT. 2020-INST. ARCOND. 2022-CFTV	FÓRUM CENTRAL N 985 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	PROPOSTO	
18	PARANAVÁ	179	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DEVA NOVO FÓRUM	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	2016-REF. AMPL. 2016-REFORMA 2018-INST. ARCOND. 2018-2019-REPAROS 2018-REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 980 TRD 980 Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
19	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	181	TJPR	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P5000	LICITAÇÃO COMPLEMENTARES SUSPENSA ATE 30/01/2023	2017-2018-INST. ARCOND. 2019-REPAROS 2019-CFTV E RENOVIAÇÃO	FÓRUM CENTRAL N 987 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
20	RIBEIRÃO DO PINHAL	185	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650	EM LICITAÇÃO	2016-REFORMA 2016-REPAROS 2016-2017-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 980 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
21	PIRAÍ DO SUL	185	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO ELETTO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	2000-REFORMA 2014-INST. ARCOND. 2014-PRÉV. INCÊNDIO 2016-REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 983 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	PROPOSTO	
22	TELÊMACO BORBA	202	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DEA REFORMA E AMPLIAÇÃO	ESCOPO A DEFINIR PELA DIREÇÃO DEA	2016-REF. ENTRADA ENERGIA 2018-REF. INST. ELÉTRICA 2020-REPAROS ATA	FÓRUM CENTRAL N 984 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
23	PRAIARIA	210	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	EXECUTIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO	EM ANÁLISE TERRENOS	2019-INST. ARCOND. 2019-INST. CENTRAL TELEF. 2018-INST. ARCOND. 2018-SIST. SOM	FÓRUM CENTRAL N 983 TRD 988 Expediente Obra 22.880.985 Expediente Projeto s N/C	PROPOSTO	
24	FRANCISCO BELTRÃO	210	ESTADO DO PARANÁ	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA	18/1000	2019-INST. ARCOND. 2019-INST. PAT. DEF. REPAROS 2020-REPAROS 2022-DIVISÓRIA M.PRR	FÓRUM CENTRAL N 986 TRD 986 Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
25	URAI	214	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650	EM LICITAÇÃO	2015-REF. AMPL. 2015-REFORMA 2018-REF. COBERTURA 2018-REF. ELÉTRICA 2015-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 986 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
26	SENGES	214	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	EM ANÁLISE NOVO TERRENO	2016-REF. AMPL. 2014-INST. ARCOND. 2015-AMPL. REDE ELÉTRICA 2015-REFORMA	FÓRUM CENTRAL N 989 TRD 989 Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
27	UNIÃO DA VITÓRIA	223	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO P8000	COMPLEMENTARES CONTRATADOS EM ANDAMENTO	2016-REF. AMPL. 2016-REPAROS 2018-REPAROS ATA 2020-REPAROS ATA	FÓRUM CENTRAL N 997 TRD 997 Expediente Obra 15020.994 Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
28	FEABIRÚ	225	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650 PLUS	EM LICITAÇÃO	2016-REF. AMPL. 2016-REFORMA 2018-REF. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 986 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
29	PITANGA	230	ESTADO DO PARANÁ	REFORMA	NADA CONSTA	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA	2016-REF. AMPL. 2016-REFORMA 2015-ENTRADA ENERGIA	FÓRUM CENTRAL N 986 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
30	JAGUAIPITÁ	230	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	EM ANÁLISE TERRENOS	2015-INST. ARCOND. 2018-REFORMA 2021-ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 986 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	PROPOSTO	
31	SARANDI	231	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DEA REFORMA E AMPLIAÇÃO	TERRENO LEGALIZADO ESTUDO DE VIABILIDADE A PROGRAMAR	2018-NOVO FÓRUM 2014-INST. ARCOND. 2018-REF. AMPL. 2016-REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 2004 TRD 2004 Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	NÃO	
32	JANDAIA DO SUL	231	ESTADO DO PARANÁ	REFORMA	CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650	EM LICITAÇÃO	2018-ARCOND. 2018-REPAROS ATA 2014-ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 985 TRD 985 Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
33	MANDAGUAÍ	237	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	SOLICITAR À COMARCA OFERTA DE TERRENOS	2016-REF. AMPL. 2015-REFORMA 2018-REF. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 977 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	NÃO	
34	SÃO JOÃO DO TRINFINHO	252	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	SOLICITAR À COMARCA OFERTA DE TERRENOS	2015-REPAROS 2016-REF. AMPL. 2018-REF. COBERTURA ESTAC. 2018-REPAROS 2020-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 984 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	NÃO	
35	TEIXEIRA SOARES	264	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	SOLICITAR À COMARCA OFERTA DE TERRENOS	2016-REF. ACESSIBILIDADE 2014-INST. ARCOND. 2015-REF. ENTRADA ENERGIA 2020-REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 985 TRD 985 Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	NÃO	
36	CÂNDIDO DE ABREU	271	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA	2016-REF. AMPL. 2016-REFORMA 2018-REF. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 985 TRD 985 Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	PROPOSTO	
37	SANTÁ MARIANA	276	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	18/1000	1888-REF. AMPL. 2006-REF. AMPL. 2003-REPAROS 2015-INST. ARCOND.	FÓRUM CENTRAL N 977 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	NÃO	
38	PRUDENTÓPOLIS	277	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	CONSTRUÇÃO FÓRUM PADRÃO 650	EM LICITAÇÃO	2016-REF. AMPL. 2016-REFORMA 2018-REF. INC. E CFVY	FÓRUM CENTRAL N 988 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	
39	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	279	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO ARQUITETÔNICO DEA REFORMA E AMPLIAÇÃO	TERRENO ELETTO AGUARDANDO LEGALIZAÇÃO	2014-REF. AMPL. 2014-INST. ARCOND. 2018-REFORMA 2020-REPAROS	FÓRUM CENTRAL N 981 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	PROPOSTO	
40	MANDAGUAÇU	287	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	ESTUDO DE VIABILIDADE A PROGRAMAR	2017-REFORMA 2017-REFORMA 2018-REF. INC. E CFVY 2018-REPAROS ATA	FÓRUM CENTRAL N 986 TRD N/C Expediente Obra N/C Expediente Projeto s N/C	TERRENO DOADO	

4. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 14 AÇÕES

Conforme evidenciado na planilha de controle a seguir, houve no mês do relatório alteração de *status* nas ações, obras e serviços de acessibilidade indicadas em amarelo.



PLANO E OBRAS DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE COMARCAS ASSINALADAS POR DEA-DAR PARA DEA-DE PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE COR AMARELA INDICA ALTERAÇÃO DESDE O ÚLTIMO RELATÓRIO COR CINZA INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO COR AZUL INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO					
	COMARCA	STATUS	OES	Observações	MOV. SEI
1	Almirante Tamandaré	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		05/08/2022, Com DP Aguardando manifestação da Comarca. 29/03/2022 Com DAR para esclarecimento quanto ao projeto. 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação	8002804
2	Capanema	ATUALIZANDO PROJETO		05/08/2022, Com DP Aguardando manifestação da Comarca 20/06/2022, Arquitetura alterando projeto. 16/07/2021, enviado para análise da DM 21/06/2021, Com DE para levantamento e contratação	8002804
3	Curitiba - Descentralizado Sta Felicidade	COM RECEBIMENTO DEFINITIVO 8518243	06/11/2019	14/10/2022, Consultoria para Termo Aditivo 29/07/2022, Prorrogado prazo de execução do contrato 18/07/2022, Atualizar seguro garantia. 18/02/2022 Formalizado novo aditivo de prazo com mais 45 dias para finalização	8518245
4	Faxinal	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		08/02/2021 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado - com DE para contratação 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto	6043134
5	Imbituva	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/06 Com DE para levantamento e contratação	7904856
6	Mangueirinha	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação	5149922
7	Morretes	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		28/09/2020 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto	8506876
8	Quedas do Iguaçu	CONTRATAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO		03/08/2022, Com DO Encaminhado ao novo Eng. Fiscal 22/06/2022, Encaminhado a Div de Projetos para contratação de projeto elétrico. 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação	8086644
9	Ribeirão Claro	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		24/03/2021 Com DE para contratação 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto	6204678
10	Santa Helena	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6016209	01/07/2020	26/01/2021 Recebimento Provisório 6016209 09/07/2020 Reforma contratada OS emitida 180 dias 12/06/2020 Aguarda documentação da construtora	8157540
11	União da Vitória - Fórum Central	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/02/2020 Submetido à comarca para análise em 12/2019	4713874
12	São Jerônimo da Serra	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		19/09/2022, Análise da conveniência da contratação 12/08/2022, Encaminhado a Direção do DEA para avaliação em face novo Fórum previsto 03/12/2020 Enviado ao fiscal da regional para contratação	8149144
13	Apucarana	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		04/10/2022, Com DO para levantamento e contratação	7785845
14	Rebouças	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		04/10/2022, Com DO para levantamento e contratação	8246198



5. DESEMBOLSOS TOTAIS

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de **R\$ 3.855.481,01** correspondentes a **49,57 %** do valor inicialmente planejado de **R\$ 7.778.564,35** para o mês, desembolsos estes segundo as seguintes classes:

	Desembolso no mês do relatório	Desembolso acumulado no ano
Obras em execução ou em Recebimento	R\$ 2.935.144,79	R\$ 29.543.159,42
Proj. complementares	R\$ 0,00	R\$ 6.306.688,13
Manutenção e Atas	R\$ 920.336,22	R\$ 17.283.355,51
	R\$ 3.855.481,01	R\$ 53.133.203,06

5.1 - EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (mês do Relatório)

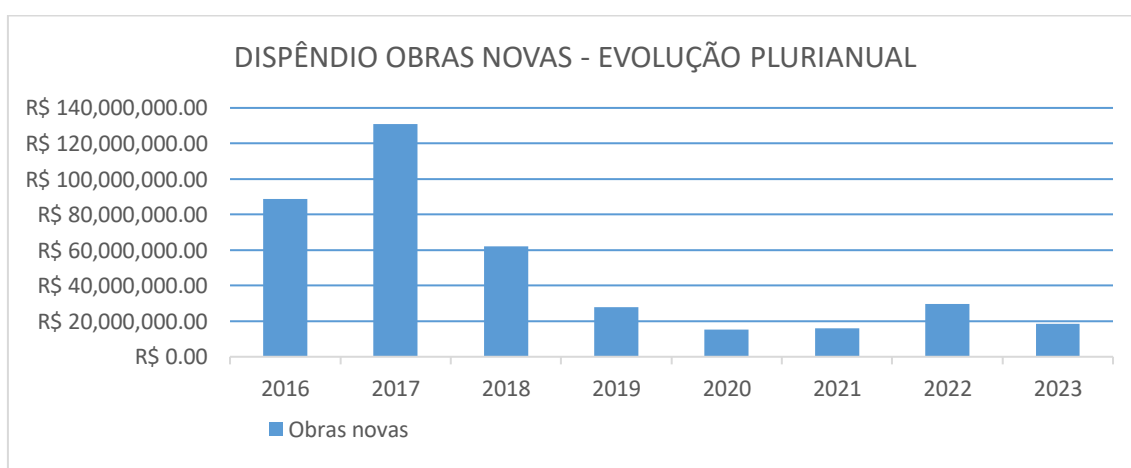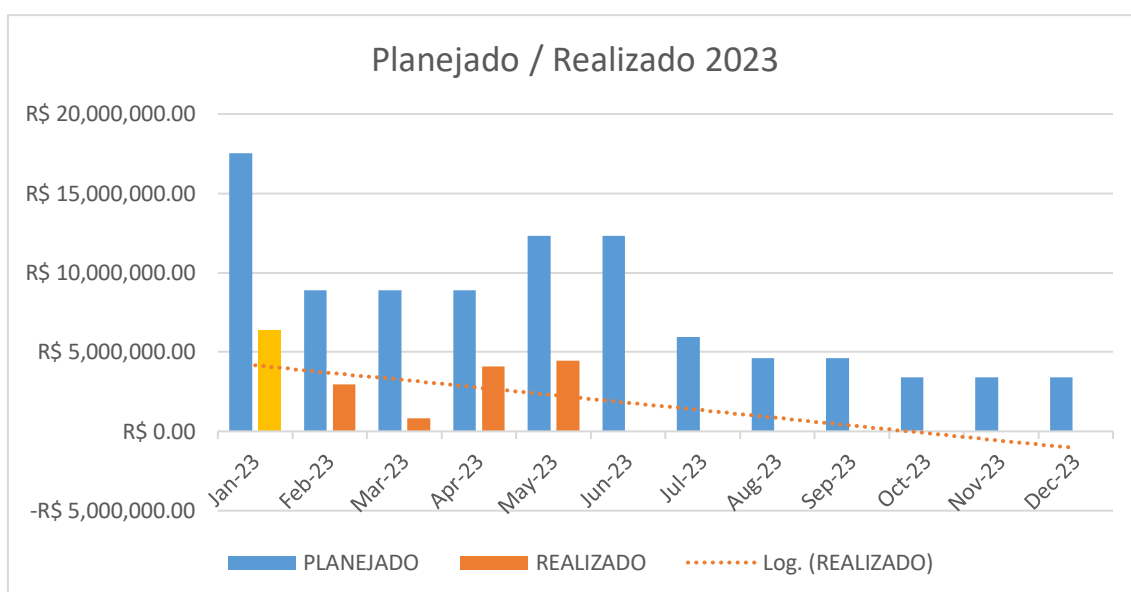

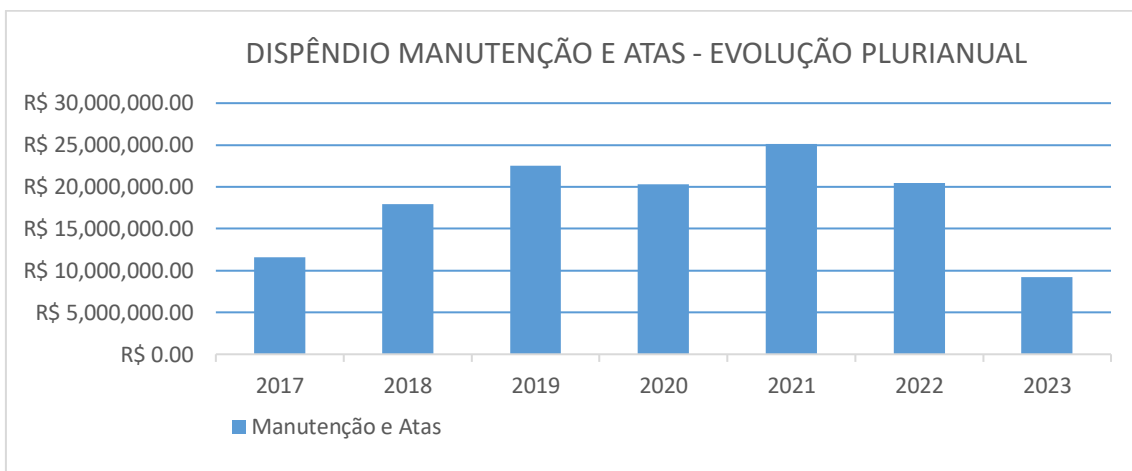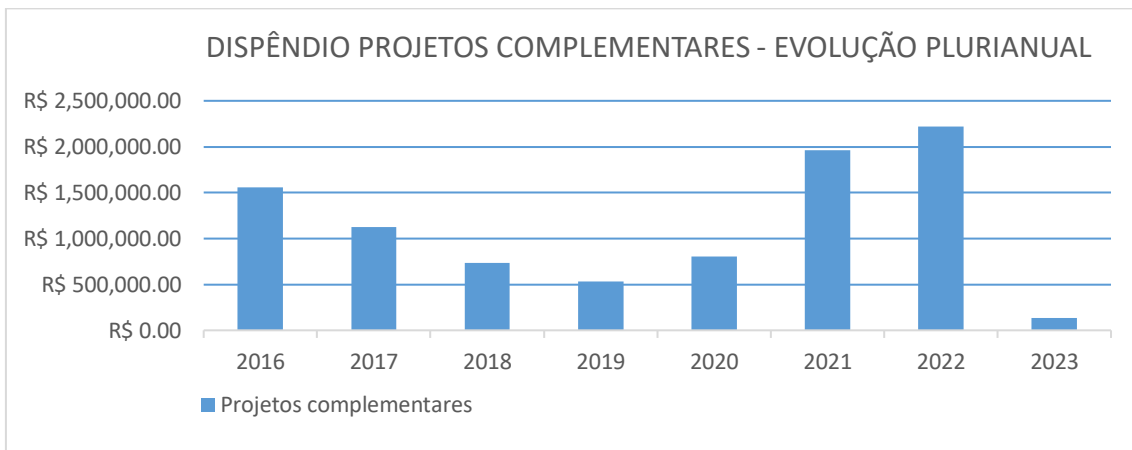


6. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES

- a. Manutenção Elevadores
- b. Manutenção Ar condicionado
- c. Manutenção Geradores
- d. Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato)
- e. Manutenção Sala Segura e Data Center
- f. Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia
- g. Ata de Instalação de Ar condicionado
- h. Demais contratações eventuais em regime de dispensa e lâmpadas LED

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor de **R\$ 920.336,22** e acumulado anual de **R\$ 17.283.355,51**, sendo que estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo:

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

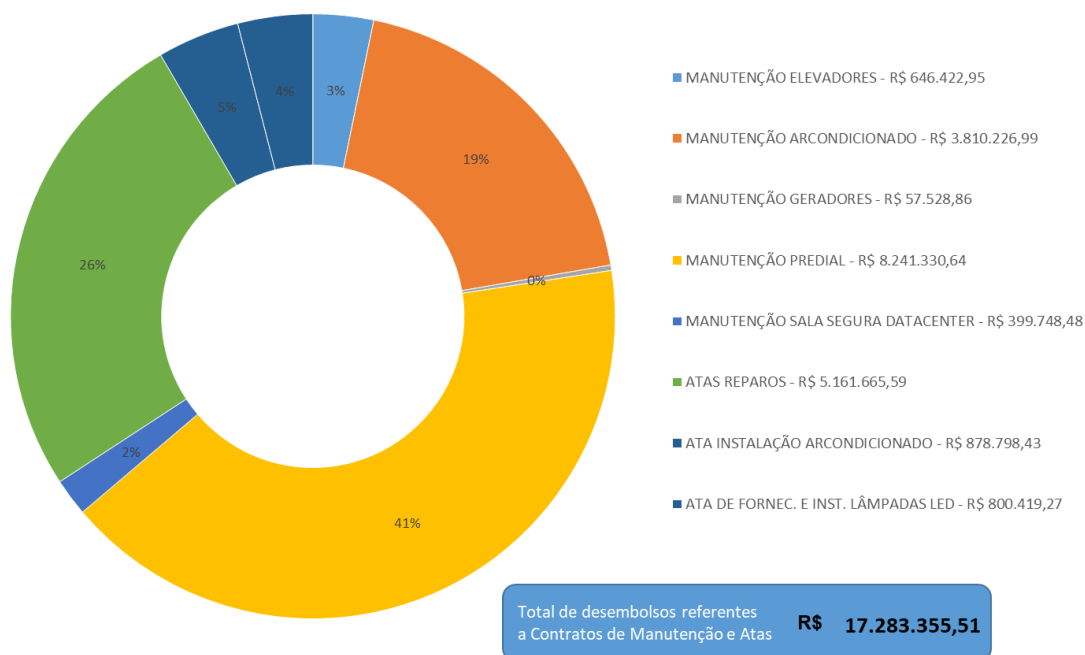

7. DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS


As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção face à próximo esgotamento da vigência do contrato: **verde** (não necessita atenção), **amarelo** (final da vigência próximo) e **vermelho** (contrato vencido).

7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada.

Regional	Contratado	Vigência	Valor contrato
Regional Leste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2023	R\$ 510.487,83
Regional Oeste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2023	R\$ 144.504,72
Regional Norte	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	04/11/2023	R\$ 183.357,72.

Desembolso no período do Relatório	R\$ 40.172,08
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 646.422,95

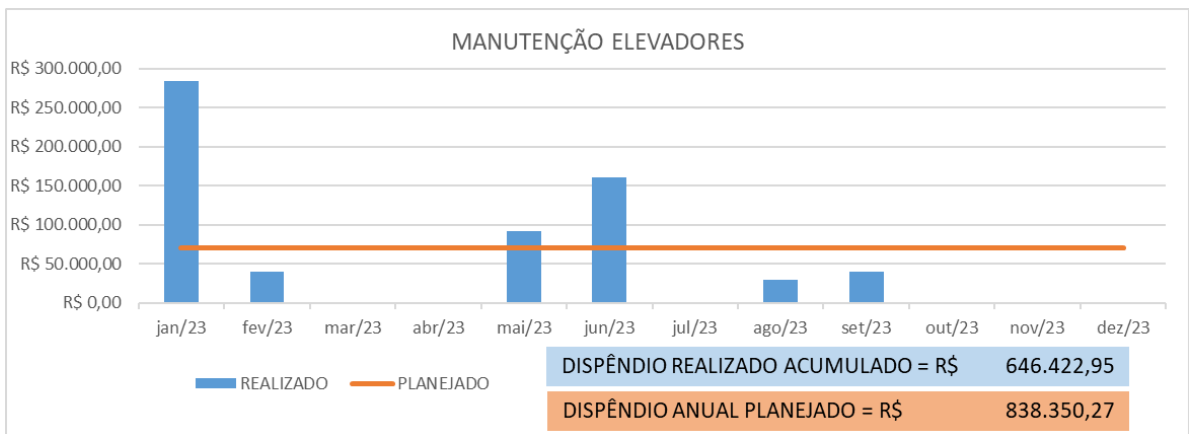


7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados em prédios do tribunal de justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	01/03/2024	R\$ 6.081.099,96

Desembolso no período do Relatório	R\$ 366.466,90
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 3.810.226,99

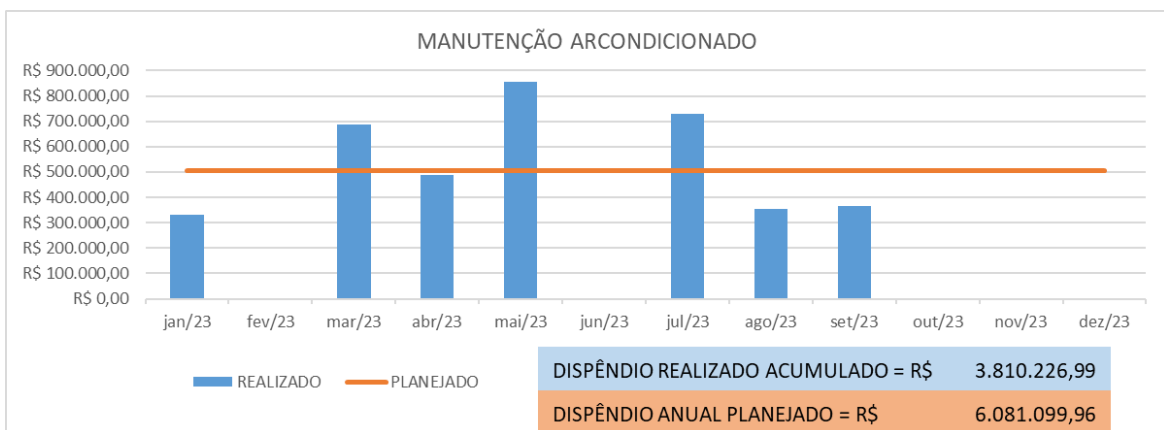


7.3 MANUTENÇÃO GERADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paraná, com fornecimento integral de peças.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME	18/08/2023	R\$ 81.055,56

Desembolso no período do Relatório	R\$ 13.509,26
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 57.528,86

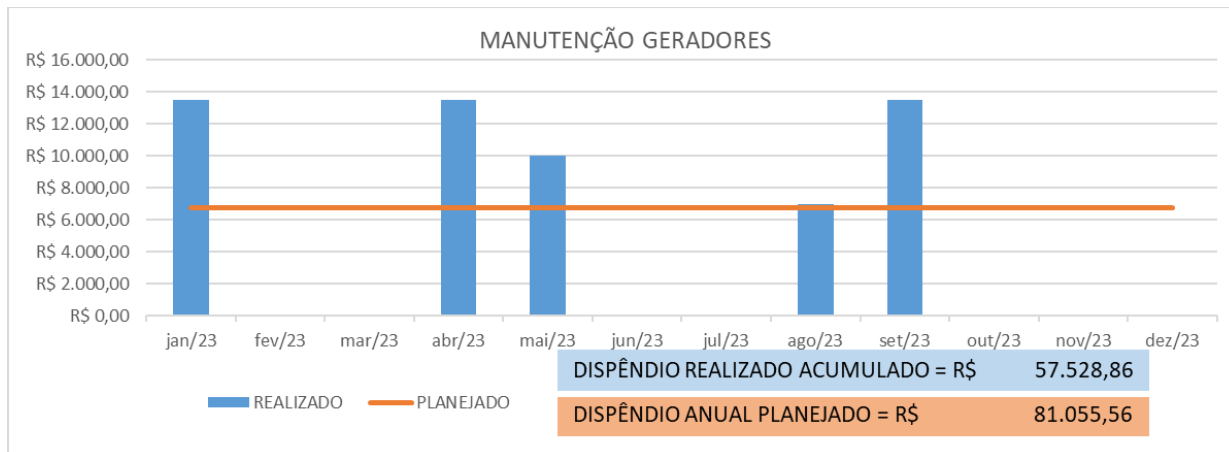


7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de materiais e insumos, para a realização dos serviços. Contrato sob gestão do Departamento do Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção do DEA a fiscal do contrato.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná	EQS ENGENHARIA S.A.	05/04/2023	R\$ 13.219.489,12

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 8.241.330,64

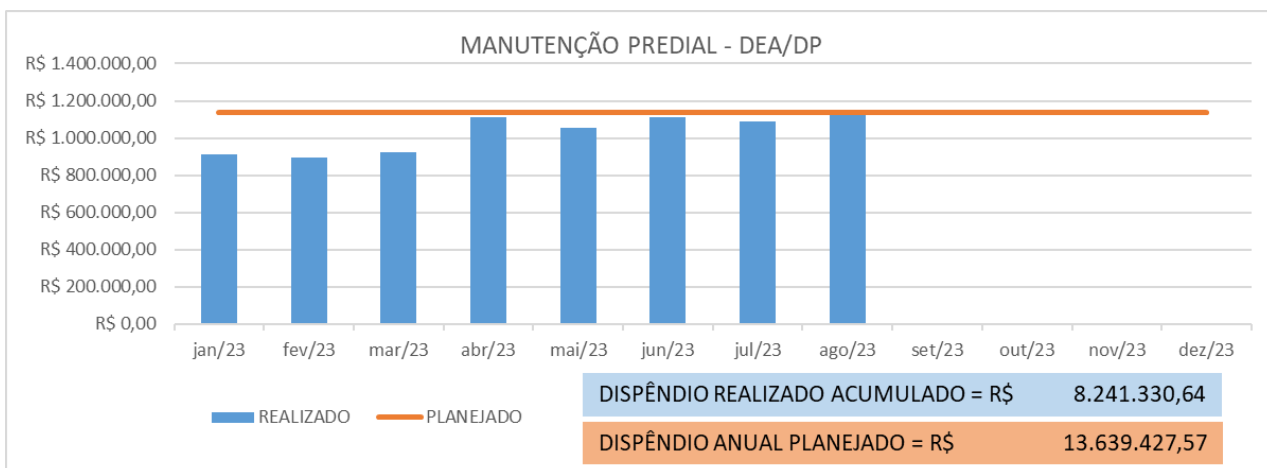

TOTAL DE SERVIÇOS (mês de referência **MAIO/2023**, fornecidos por DEA-DM)

Relação das unidades do contrato

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
CAMPO MOURÃO	Atestado	R\$ 14.189,27
CASCADEL	Atestado	R\$ 11.433,66
CORNÉLIO PROCÓPIO	Atestado	R\$ 8.006,74
CRUZEIRO DO OESTE	Atestado	R\$ 9.940,31
FOZ DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 850,07
GUARAPUAVA	Atestado	R\$ 18.401,31
LONDRINA	Atestado	R\$ 6.652,62
MARINGÁ	Atestado	R\$ 8.996,82
PATO BRANCO	Atestado	R\$ 11.580,02
PONTA GROSSA	Atestado	R\$ 6.521,14
RIBEIRÃO CLARO	Atestado	R\$ 20.223,62
TELÊMACO BORBA	Atestado	R\$ 1.922,94
UNIÃO DA VITÓRIA	Atestado	R\$ 7.859,48
13 UNIDADES	TOTAL:	R\$ 126.577,99

Resumos das cidades

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
ALTO PIQUIRI	Atestado	R\$ 785,15
ALTÔNIA	Atestado	R\$ 16,24
APUCARANA	Atestado	R\$ 383,86
ARAPONGAS	Atestado	R\$ 418,72
ARAPOTI	Atestado	R\$ 183,10
ASSAÍ	Atestado	R\$ 1.069,22
BANDEIRANTES	Atestado	R\$ 2.695,58
BARRAÇÃO	Atestado	R\$ 1.139,81
BELA VISTA DO PARAÍSO	Atestado	R\$ 1.086,87
CAMBARÁ	Atestado	R\$ 1.848,47
CAMPINA DA LAGOA	Atestado	R\$ 258,70
CANTAGALO	Atestado	R\$ 4.014,30
CAPANEMA	Atestado	R\$ 379,17
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	Atestado	R\$ 20,76

CASCADEL	Atestado	R\$ 612,16
CASTRO	Atestado	R\$ 295,85
CIANORTE	Atestado	R\$ 6.587,20
COLORADO	Atestado	R\$ 877,75
CONGONHINHAS	Atestado	R\$ 1.159,15
CORBÉLIA	Atestado	R\$ 7,78
CORNELIO PROCOPIO	Atestado	R\$ 3.380,97
CORONEL VIVIDA	Atestado	R\$ 477,04
DOIS VIZINHOS	Atestado	R\$ 643,93
ENGENHEIRO BELTRÃO	Atestado	R\$ 1.520,59
FORMOSA DO OESTE	Atestado	R\$ 223,33
FOZ DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 839,00
FRANCISCO BELTRAO	Atestado	R\$ 656,36
GOIOERE	Atestado	R\$ 3.661,87
GUÁIRA	Atestado	R\$ 529,96
GUARANIAÇU	Atestado	R\$ 412,88
GUARAPUAVA	Atestado	R\$ 8.616,05
IBAITI	Atestado	R\$ 335,23
IBIPORA	Atestado	R\$ 1.667,11
ICARAÍMA	Atestado	R\$ 376,04
IMBITUVA	Atestado	R\$ 186,30
IPIRANGA	Atestado	R\$ 2.555,12
IPORÃ	Atestado	R\$ 1,01
IVAIPORÃ	Atestado	R\$ 85,31
JACAREZINHO	Atestado	R\$ 8.391,59
JAGUARIAÍVA	Atestado	R\$ 1.758,57
JANDAIA DO SUL	Atestado	R\$ 406,20
LARANJEIRAS DO SUL	Atestado	R\$ 4.167,02
LOANDA	Atestado	R\$ 307,14
LONDRINA	Atestado	R\$ 818,93
MALLET	Atestado	R\$ 135,54
MANOEL RIBAS	Atestado	R\$ 175,39
MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Atestado	R\$ 1.651,47
MARINGA	Atestado	R\$ 4.450,36
MARMELEIRO	Atestado	R\$ 4.132,70
NOVA AURORA	Atestado	R\$ 373,06
NOVA ESPERANÇA	Atestado	R\$ 1.299,52
NOVA FÁTIMA	Atestado	R\$ 81,72
NOVA LONDRINA	Atestado	R\$ 212,90
ORTIGUEIRA	Atestado	R\$ 45,33
PALMAS	Atestado	R\$ 3.912,88
PALMEIRA	Atestado	R\$ 37,26
PALMITAL	Atestado	R\$ 146,26
PALOTINA	Atestado	R\$ 1.022,27
PARANACITY	Atestado	R\$ 378,00
PEABIRU	Atestado	R\$ 1.041,75
PÉROLA	Atestado	R\$ 350,12
PINHÃO	Atestado	R\$ 50,63
PIRAÍ DO SUL	Atestado	R\$ 114,85
PITANGA	Atestado	R\$ 166,33
PONTA GROSSA	Atestado	R\$ 712,93
PORECATU	Atestado	R\$ 1.000,35
PRUDENTÓPOLIS	Atestado	R\$ 30,73
REBOUÇAS	Atestado	R\$ 1.034,60
RIBEIRÃO CLARO	Atestado	R\$ 1.629,36

ROLÂNDIA	Atestado	R\$ 207,56
SANTA FÉ	Atestado	R\$ 831,47
SANTA HELENA	Atestado	R\$ 475,26
SANTA ISABEL DO IVAÍ	Atestado	R\$ 122,28
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	Atestado	R\$ 742,55
SÃO JERÔNIMO DA SERRA	Atestado	R\$ 200,13
SAO JOAO	Atestado	R\$ 617,30
SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Atestado	R\$ 4.622,05
SÃO MATEUS DO SUL	Atestado	R\$ 12,36
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 11,07
SARANDI	Atestado	R\$ 211,22
SENGÉS	Atestado	R\$ 724,72
SIQUEIRA CAMPOS	Atestado	R\$ 5.929,08
TEIXEIRA SOARES	Atestado	R\$ 248,55
TERRA BOA	Atestado	R\$ 3.537,41
TERRA RICA	Atestado	R\$ 22,26
TERRA ROXA	Atestado	R\$ 2.503,96
TOLEDO	Atestado	R\$ 7.501,12
TOMAZINA	Atestado	R\$ 1.426,56
UBIRATÃ	Atestado	R\$ 1.158,31
UMUARAMA	Atestado	R\$ 348,08
UNIAO DA VITORIA	Atestado	R\$ 2.976,52
WENCESLAU BRAZ	Atestado	R\$ 2.104,48
92 CIDADES	TOTAL:	R\$ 126.577,99

- Foram realizadas 348 intervenções corretivas e 70 preventivas nas comarcas do interior, no período.

- No mês de abril foram substituídas 646 lâmpadas e refletores para o interior.

Relatório Regional 1

CIDADE	VALOR APROVADO
Almirante Tamandaré	R\$ 33,34
Antonina	R\$ -
Araucária	R\$ -
Bocaiúva Do Sul	R\$ -
Campina Grande Do Sul	R\$ 29,00
Campo Largo	R\$ 730,40
Cerro Azul	R\$ -
Colombo	R\$ 522,91
Curitiba	R\$ 73.607,89
Fazenda Rio Grande	R\$ 4.249,74
Guaratuba	R\$ -

Lapa	R\$ -
Matinhos	R\$ 239,74
Morretes	R\$ 329,93
Paranaguá	R\$ 1.238,89
Pinhais	R\$ 7.183,54
Piraquara	R\$ -
Pontal Do Paraná	R\$ 1.676,00
	R\$ 408,55
Rio Branco do Sul	R\$ 703,64
Rio Negro	R\$ -
São José dos Pinhais	R\$ 4.638,29
TOTAL MEDIÇÃO	R\$ 95.591,86
TOTAL ACUMULADO CONTRATO 3 (23-24)	R\$ 574.846,61
TOTAL ACUMULADO 2023*	R\$ 979.727,50

- Foram abertas 643 Ordens de Serviço do tipo Corretivas de 01/08/2023 à 31/08/2023
- Foram atendidas 565 Ordens de Serviço do tipo Corretivas de 01/08/2023 à 31/08/2023
- Foram atendidas 9 Ordens de Serviço do tipo Preventivas 01/08/2023 à 31/08/2023


7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER

Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Álvaro Ramos	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	28/07/2024	R\$ 403.635,13

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Prédio Anexo	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	01/04/2024	R\$ 293.675,58
Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2)			R\$ 20.657,98
Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2)			R\$ 399.748,48

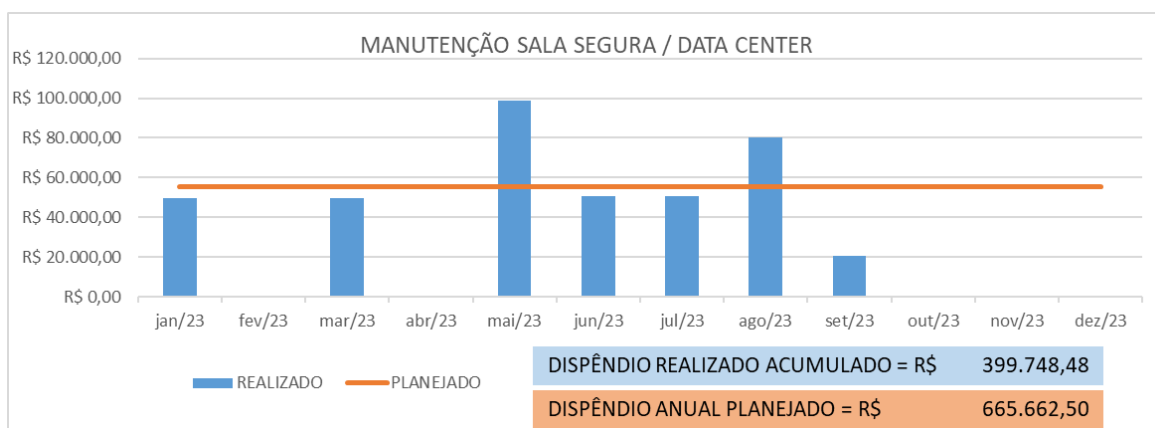


7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, reparos, adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas comarcas componentes das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, Francisco Beltrão, Londrina, Jacarezinho, Umuarama, Ponta Grossa, Maringá e Curitiba.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
REGIONAL 1 - UMUARAMA/MARINGÁ	ABEL SGARIONI ENG E CONST CIVIL LTDA	13/01/2024	R\$ 2.000.000,00
REGIONAL 2 - LONDRINA/JACAREZINHO	FRAVAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	01/02/2024	R\$ 2.000.000,00
REGIONAL 3 - CASCAVEL/F BELTRÃO	CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA	07/12/2023	R\$ 1.500.000,00
REGIONAL 4 - GUARAPUAVA/PONTA GROSSA	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	04/08/2022	R\$ 2.000.000,00
REGIONAL 5 - RMC	JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP	25/01/2024	R\$ 1.000.000,00


REGIONAL 6 - CURITIBA	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	25/03/2023	R\$ 2.500.000,00
REGIONAL MARINGÁ	COVIARTES MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	03/05/2023	R\$ 1.000.000,00
Desembolso no período do Relatório			R\$ 281.493,29
Desembolso acumulado no ano do Relatório			R\$ 5.161.665,59

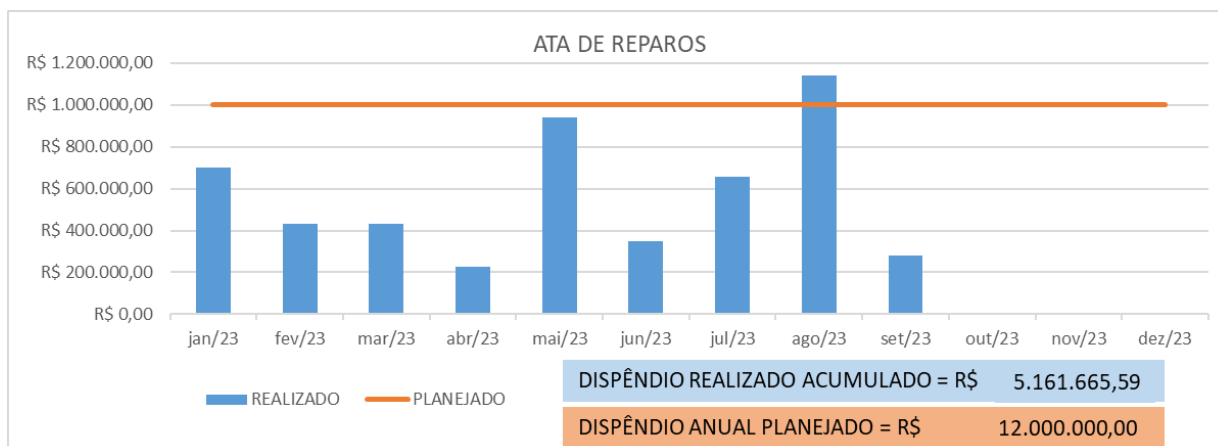

7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do estado do paraná.


Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Paraná total	ARBOM COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	23/06/2023	R\$ 1.200.000,00
Desembolso no período do Relatório		R\$ 198.036,71	
Desembolso acumulado no ano do Relatório		R\$ 878.798,43	

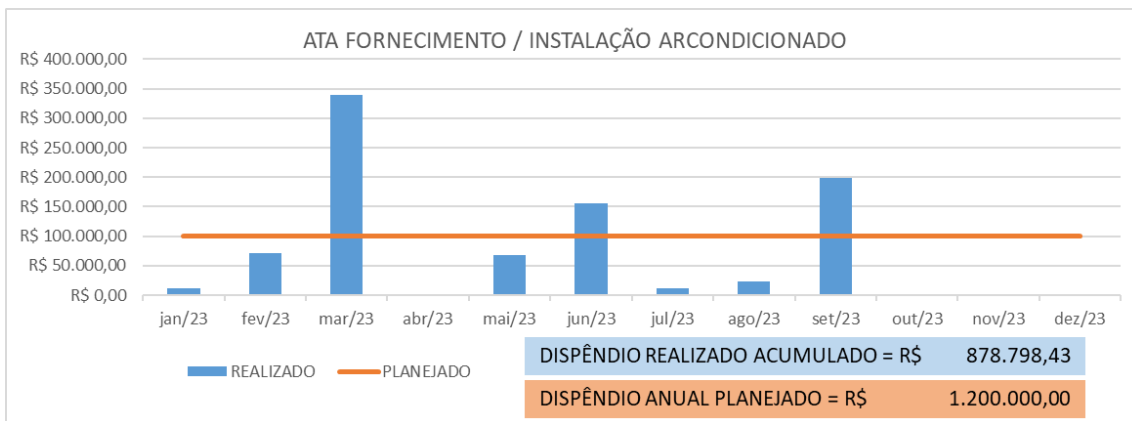

7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED

Destino/objeto	Contratado	Vigência	Valor contratado
ESTADO – instalação lâmpadas LED	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA EPP	10/01/2023	R\$ 3.400.089,00

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 800.419,27

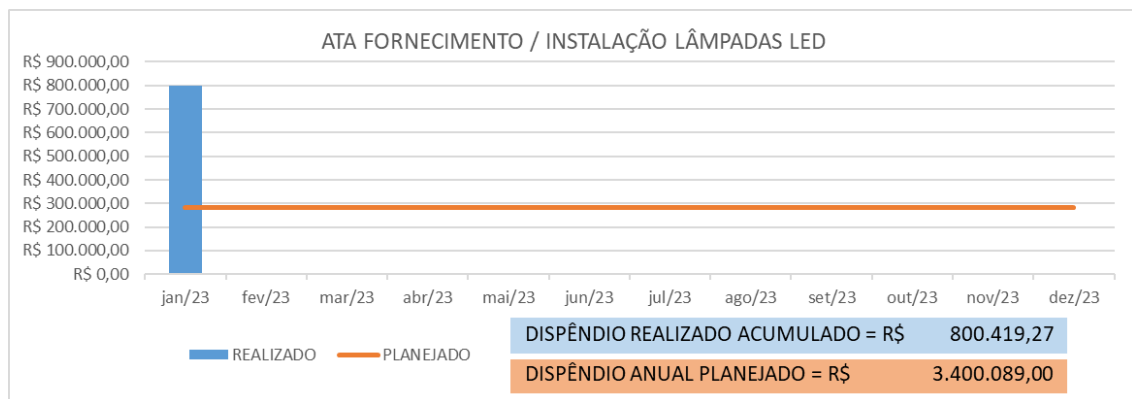

7.9 ATIVIDADES RELACIONADAS A ARQUITETURA E DESIGN

ITEM	ATIVIDADE SPA - SETEMBRO	HELENA	GEORGIA	RENATA	GABRIEL	THAÍS
1	ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS / EXPEDIENTES	18	96	10	10	2
2	ACOMPANHAMENTO / AVALIAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES					
3	ADAPTAÇÃO PROJETO PADRÃO - IMPLANTAÇÃO / DETALHES					3
4	ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO					
5	ANÁLISE DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM					
6	ANÁLISE DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO FÓRUM					
7	ANÁLISE EDIFÍCIO PARA LOCAÇÃO					
8	ANÁLISE ESPAÇOS / ÁREAS PARA OCUPAÇÃO			1	2	
9	APROVAÇÃO DE PROJETOS NA PREFEITURA OU ÓRGÃOS COMPETENTES			2	4	
10	ATUALIZAÇÃO DE PLANTA			1		1
11	CHECKLIST DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO					
12	CHEFIA - ASSESSORIA TÉCNICA AOS EXPEDIENTES / ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS / RRT		145			
13	COMUNICAÇÃO EMAILS, TEAMS, WHATSAPP PARA INFORMAÇÃO DE PROJETOS	47	89	39	35	17
14	CONSULTA DE LEGISLAÇÕES/ PREFEITURA PARA AMPLIAÇÃO			2	2	
15	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO TÉCNICO NO SEI	7	7	8	15	7
16	ESPECIFICAÇÕES, APROVAÇÃO DE MATERIAIS DE OBRA, SERVIÇOS E PROJETOS			4		1
17	ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA - EVT					
18	LEVANTAMENTO COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA					
19	LEVANTAMENTO TÉCNICO DO ESPAÇO / LOCAL			1	1	
20	LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO			3	2	
21	PREENCHIMENTO DE CHECKLIST PARA ANÁLISE/ AVALIAÇÃO TÉCNICA					
22	PRODUÇÃO DE IMAGENS, TEXTURAS (RENDER), PERSPECTIVAS				1	
23	PROJETO ARQUITETÔNICO - AMPLIAÇÃO E REFORMA					2
24	PROJETO ARQUITETÔNICO - FÓRUM NOVO					
25	PROJETO ARQUITETÔNICO - REFORMA E READEQUAÇÕES	11		12	11	3
26	PROJETO DE ACESSIBILIDADE				2	4
27	PROJETO DE INTERIORES					
28	PROJETO DE LAYOUT (DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO)					
29	PROJETO DE PAISAGISMO				3	2
30	PROJETO DE PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO					
31	PROJETO DE REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIO					
32	PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO					
33	PROJETO EXECUTIVO DE MOBILIÁRIO					
34	REUNIÃO	8	31	10	11	3
35	VISITA TÉCNICA DE SERVIÇOS/ OBRAS, ASSESSORIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO / VISTORIA	2		3	1	
TOTAL ATIVIDADES		93	368	96	100	45
TOTAL FINAL		702				
