

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



RELATÓRIO PLANO DE OBRAS
ABRIL/2022

SUMÁRIO

1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO	4
1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 4 OBRAS	4
1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS	6
1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 4 OBRAS	7
1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 24 PROJETOS	8
1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 5 PROJETOS	13
1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEEA.....	15
1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS	16
1.1 TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS	18
2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR	20
3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES)	22
4. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	25
5. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 15 AÇÕES	27
6. DESEMBOLSOS TOTAIS	29
6.1 EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (medido até o mês do Relatório)	30
7. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS	31
7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES	32
7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO.....	33
7.3 MANUTENÇÃO GERADORES	34
7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL	35
7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER.....	39
7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA	40
7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	43
7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED	44
8 ANEXO	45
8.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS	45
8.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS.....	46
8.3 MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS	48
8.4 REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS	48
8.5 MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS	50

O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura.

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DIAGRI e verificando os respectivos protocolos, apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 06/05/2022.

Observações:

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos:
 - a. Todo dado indicado de *% financeiro executado* refere-se ao desempenho financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF, Departamento Econômico Financeiro.
 - b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário macro, onde não houver dados ou relatórios de medição de obra ou serviço referentes ao desempenho físico, está-se considerando desempenho financeiro consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo.
2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada
 - a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
 - b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO.

1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 4 OBRAS

1	LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL	Construção Bloco Criminal	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 62.624.349,34	
	Contratado	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	Emissão OES	março, 2020	
	Data prevista conclusão	julho, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	27	
	Prazo decorrido de execução (meses)	25	
	% físico realizado	26,77%	
	Medição realizada	6 ^a / 20	
	Medição requerida	6 ^a	
	% financeiro realizado consolidado	33,95%	
	Saldo a pagar	R\$ 41.364.609,79	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	Termo de Recebimento	.	
	Inauguração/Ocupação		
	Obs: Contrato anterior abr/2019 rescindido fev/2020 realizado 6,75%		


2	AMPÉRE - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 6.133.337,92	
	Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2019	
	Data prevista conclusão	dezembro, 2021	
	Prazo previsto execução (meses)	25	
	Prazo decorrido de execução (meses)	30	
	% físico realizado	60,16%	
	Medição realizada	11 ^a / 14	
	Medição requerida	11 ^a	
	% financeiro realizado consolidado	58,82%	
	Saldo a pagar	R\$ 2.525.703,95	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	Termo de Recebimento	.	
	Inauguração/Ocupação		

3	FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 40.872.133,96	
	Contratado	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2020	
	Data prevista conclusão	julho, 2022	
	Prazo previsto execução (meses)	20	
	Prazo decorrido de execução (meses)	18	

% físico realizado	22,75%
Medição realizada	7 ^a / 18
Medição requerida	7 ^a
% financeiro realizado consolidado	19,15%
Saldo a pagar	R\$ 33.046.237,22
% financeiro não consolidado (se houver)	
Termo de Recebimento	.
Inauguração/Ocupação	

4	CORBÉLIA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 9.378.308,06	
Contratado	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA	
Emissão OES	novembro, 2021	
Data prevista conclusão	janeiro, 2023	
Prazo previsto execução (meses)	13	
Prazo decorrido de execução (meses)	5	
% físico realizado	4,66%	
Medição realizada	1 ^a / 13	
Medição requerida	2 ^a	
% financeiro realizado consolidado	3,55%	
Saldo a pagar	R\$ 9.045.122,11	
% financeiro não consolidado (se houver)		
Termo de Recebimento	.	
Inauguração/Ocupação		

Análise de desempenho anual de desembolsos com obras em andamento:

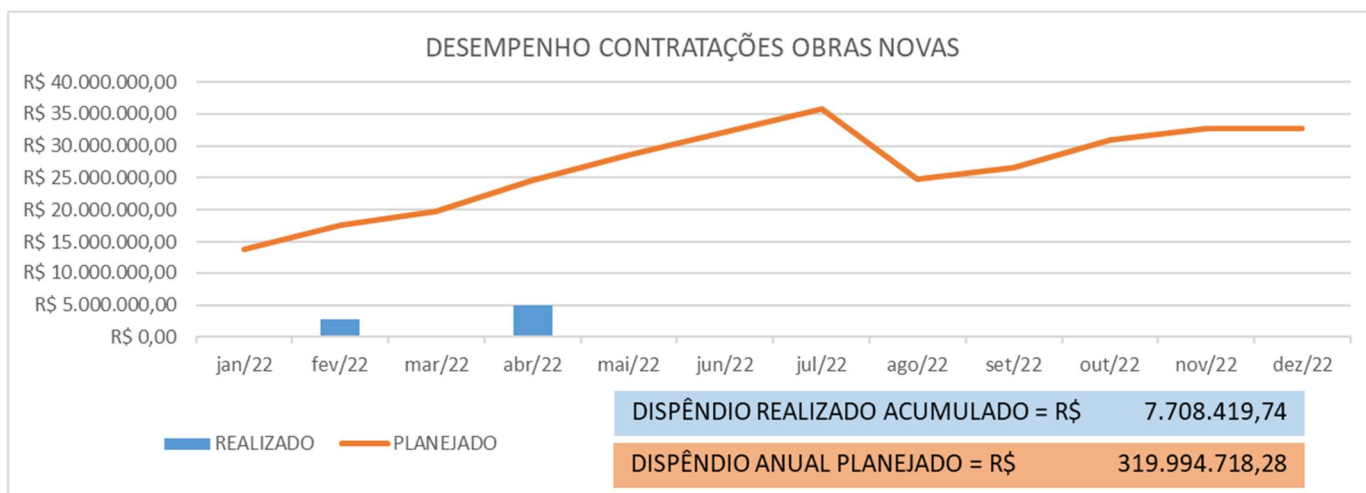

1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS

No período, não foi emitido Termo de Recebimento Definitivo para as obras.

1	BELA VISTA DO PARAÍSO	Construção Fórum Novo
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 8.156.223,56
	Contratado	CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA
	Emissão OES	maio, 2018
	Data prevista conclusão	setembro, 2019
	Prazo previsto execução (meses)	16
	Prazo decorrido de execução (meses)	27 FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	100,00%
	Termo de Recebimento	Provisório PROV. Março, 2020
		Definitivo programado sem programação
	Inauguração/Ocupação	janeiro, 2021
	Conclusão	

2	CURITIBA - PRÉDIO ANEXO	EM OBRA SONORIZAÇÃO PRÉDIO ANEXO
	Valor da Obra (incluídos aditivos)	R\$ 4.953.726,74
	Contratado	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	Emissão OES	outubro, 2019
	Data prevista conclusão	maio, 2020
	Prazo previsto execução (meses)	6
	Prazo decorrido de execução (meses)	31 FORA DA DATA PREVISTA
	% físico realizado	100,00%
	% financeiro realizado consolidado	96,78%
	Termo de Recebimento	Provisório PROV. Outubro, 2021
		Definitivo programado sem programação
	Inauguração/Ocupação	outubro, 2021
	Conclusão	

1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 4 OBRAS

1	CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 35.000.000,00
	Início do procedimento de preparação da licitação	abril, 2022
	Prazo estimado emissão Edital ao DP	abril, 2022
	Publicação do Edital	maio, 2022
	Homologação da Licitação	previsão maio, 2022
	Assinatura do Contrato	previsão junho, 2022
	Fase atual	Em análise Recebimento Definitivo Projetos

2	NOVA AURORA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 10.662.652,24
	Início do procedimento de preparação da licitação	novembro, 2021
	Prazo estimado emissão Edital ao DP	FINALIZADO
	Publicação do Edital	FINALIZADO
	Homologação da Licitação	previsão maio, 2022
	Assinatura do Contrato	previsão maio, 2022
	Fase atual	Em licitação

3	TERRA RICA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 10.500.000,00
	Início do procedimento de preparação da licitação	dezembro, 2021
	Prazo estimado emissão Edital ao DP	FINALIZADO
	Publicação do Edital	FINALIZADO
	Homologação da Licitação	previsão abril, 2022
	Assinatura do Contrato	previsão maio, 2022
	Fase atual	Em licitação

4	PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 10.500.000,00
	Início do procedimento de preparação da licitação	março, 2022
	Prazo estimado emissão Edital ao DP	FINALIZADO
	Publicação do Edital	maio, 2022
	Homologação da Licitação	previsão julho, 2022
	Assinatura do Contrato	previsão julho, 2022
	Fase atual	edital enviado ao DP

1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 24 PROJETOS

1	MARINGÁ - PROJETOS	Construção Fórum Novo	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 899.994,58	
	Contratado	GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	
	Emissão OES	outubro, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	41	
	Prazo decorrido de execução (meses)	43	
	Previsão de conclusão	março, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	3
	% financeiro realizado consolidado	93,61%	
	Saldo a pagar	R\$ 57.548,84	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	MARINGÁ - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
		R\$ 199.633,89	93,75%

2	CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS	Construção CJC	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 4.981.060,31	
	Contratado	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES	junho, 2018	
	Prazo previsto execução (meses)	54	
	Prazo decorrido de execução (meses)	47	
	Previsão de conclusão	dezembro, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	6
		Fases recebidas	1
	% financeiro realizado consolidado	62,27%	
	Saldo a pagar	R\$ 1.879.187,07	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO CONTRATO		
	CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
		R\$ 901.144,22	63,49%

3	COLOMBO - PROJETOS	Construção Fórum Novo	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 457.187,55	
	Contratado	SOBE SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME	
	Emissão OES	dezembro, 2019	
	Prazo previsto execução (meses)	36	
	Prazo decorrido de execução (meses)	29	
	Previsão de conclusão	dezembro, 2022	

% físico realizado	Fases previstas	5
	Fases recebidas	2
% financeiro realizado consolidado	26,74%	
Saldo a pagar	R\$ 334.948,70	
% financeiro não consolidado (se houver)		
CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO AMBIENTAL		
COLOMBO - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO	R\$ 114.800,00	20,00%

4	PONTA GROSSA - PROJETOS	Construção Fórum Novo	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 784.739,75	
	Contratado	ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	Emissão OES (reinício de contrato)	outubro, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	21	
	Prazo decorrido de execução (meses)	19	
	Previsão de conclusão	julho, 2022	
	% físico realizado	Fases previstas	5
		Fases recebidas	2
	% financeiro realizado consolidado	20,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 627.791,80	
	% financeiro não consolidado (se houver)		
	PONTA GROSSA - ASSESSORAMENTO	Valor do contrato	% realizado
		R\$ 164.800,00	7,00%

	CAMPO MOURÃO, PARANAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA - NOVO FÓRUM PADRÃO 10000		
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 447.447,00	
	Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME	
	Emissão OES	julho, 2020	
	% físico realizado	Fases previstas	13
		Fases recebidas	2
	% financeiro realizado consolidado	10,00%	
	Saldo a pagar	R\$ 402.702,30	
	% financeiro não consolidado (se houver)	25,00%	

5	CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	
	Emissão OES	julho, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	20	
	Prazo decorrido de execução (meses)	22	
	Previsão de conclusão	março, 2022	
6	PARANAÍ - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	
	Emissão OES	julho, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	22	
	Prazo decorrido de execução (meses)	22	
	Previsão de conclusão	maio, 2022	
7	UNIÃO DA VITÓRIA - PADRÃO 10.000	Construção Fórum Novo	
	Emissão OES	julho, 2020	
	Prazo previsto execução (meses)	28	
	Prazo decorrido de execução (meses)	22	

NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO SUL, PONTAL DO PARANÁ, TERRA RICA, PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MANGUEIRINHA, WENCESLAU BRAZ – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800	
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 397.624,71
Contratado	JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME
Emissão OES	fevereiro, 2021
% físico realizado	Fases previstas 34 Fases recebidas 4
% financeiro realizado consolidado	55,61%
Saldo a pagar	R\$ 176.507,28
% financeiro não consolidado (se houver)	
NOVA AURORA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	9
Prazo decorrido de execução (meses)	10
Previsão de conclusão	dezembro, 2021
8 JAGUARIAÍVA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	13
Prazo decorrido de execução (meses)	14
Previsão de conclusão	abril, 2022
9 BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 1500	Construção Novo Fórum
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	14
Prazo decorrido de execução (meses)	14
Previsão de conclusão	maio, 2022
10 PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	11
Prazo decorrido de execução (meses)	13
Previsão de conclusão	fevereiro, 2022
11 TERRA RICA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	11
Prazo decorrido de execução (meses)	13
Previsão de conclusão	fevereiro, 2022
12 PEABIRÚ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	12
Prazo decorrido de execução (meses)	14
Previsão de conclusão	março, 2022
13 IPORÃ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021
Prazo previsto execução (meses)	12
Prazo decorrido de execução (meses)	14
Previsão de conclusão	março, 2022
14 SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
Emissão OES	fevereiro, 2021

	Prazo previsto execução (meses)	13
	Prazo decorrido de execução (meses)	14
	Previsão de conclusão	abril, 2022
15	MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	fevereiro, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	14
	Prazo decorrido de execução (meses)	14
	Previsão de conclusão	maio, 2022
16	WENCESLAU BRAZ - PADRÃO 1500	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	fevereiro, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	13
	Prazo decorrido de execução (meses)	14
	Previsão de conclusão	abril, 2022

	JANDAIA DO SUL, QUEDAS DO IGUAÇÚ, COLORADO, PRUDENTÓPOLIS, SÃO MATEUS DO SUL, LOANDA E MARIALVA – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800	
	Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 208.999,00
	Contratado	PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME
	Emissão OES	julho, 2021
	% físico realizado	Fases previstas 10 Fases recebidas 1
	% financeiro realizado consolidado	0,00%
	Saldo a pagar	R\$ 208.999,00
	% financeiro não consolidado (se houver)	
17	JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	julho, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	9
	Prazo decorrido de execução (meses)	10
	Previsão de conclusão	abril, 2022
18	PRUDENTÓPOLIS - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	julho, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	12
	Prazo decorrido de execução (meses)	10
	Previsão de conclusão	julho, 2022
19	QUEDAS DO IGUAÇÚ - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	julho, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	10
	Prazo decorrido de execução (meses)	10
	Previsão de conclusão	maio, 2022
20	LOANDA - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	julho, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	11
	Prazo decorrido de execução (meses)	10
	Previsão de conclusão	junho, 2022
21	MARIALVA - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
	Emissão OES	julho, 2021
	Prazo previsto execução (meses)	12
	Prazo decorrido de execução (meses)	10
	Previsão de conclusão	julho, 2022
22	SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo

Emissão OES	julho, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	13	
Prazo decorrido de execução (meses)	10	
Previsão de conclusão	agosto, 2022	
23	COLORADO - PADRÃO 1800	Construção Fórum Novo
Emissão OES	julho, 2021	
Prazo previsto execução (meses)	11	
Prazo decorrido de execução (meses)	10	
Previsão de conclusão	junho, 2022	

24	CAMPO MOURÃO	Usina Fotovoltaica	
Valor do Contrato (incluídos aditivos)	R\$ 119.736,04		
Contratado	MORAN JPROJETOS E MONTAGENS ELÉTRICAS EIRELI		
Emissão OES	outubro, 2021		
Prazo previsto execução (meses)	4		
Prazo decorrido de execução (meses)	6		
Previsão de conclusão	fevereiro, 2022		
% físico realizado	Fases previstas	3	
	Fases recebidas	1	
% financeiro realizado consolidado	15,00%		
Saldo a pagar	R\$ 101.775,63		
% financeiro não consolidado (se houver)			

Análise de desempenho anual de desembolsos com projetos complementares:



1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 5 PROJETOS

1	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PADRÃO 5000		Construção Fórum Novo	PRAZO OK	
				ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 100.000,00		ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da contratação			INICIADO	
	Prazo estimado homologação da contratação			junho, 2022	
	Prazo estimado emissão OES			julho, 2022	
	Prazo estimado conclusão dos projetos			fevereiro, 2023	
	Fase ou localização atual DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES				

2	IRATI - PADRÃO 5000		Construção Fórum Novo	PRAZO OK	
				ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 100.000,00		ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da contratação			INICIADO	
	Prazo estimado homologação da contratação			junho, 2022	
	Prazo estimado emissão OES			julho, 2022	
	Prazo estimado conclusão dos projetos			dezembro, 2022	
	Fase ou localização atual DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES				

3	CURITIBA - SEDE MAUÁ		Usina Fotovoltáica	PRAZO OK	
				ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 60.000,00		ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da licitação			INICIADO	
	Prazo estimado emissão Edital ao DP			EMITIDO	
	Prazo estimado publicação do Edital			PUBLICADO	
	Prazo estimado homologação da licitação			maio, 2022	
	Prazo estimado emissão OES			junho, 2022	
	Fase ou localização atual EM LICITAÇÃO PELO DP				

4	CENTENÁRIO DO SUL, RIBEIRÃO DO PINHAL, CLEVELÂNDIA, URAÍ, FAXINAL, JOAQUIM TÁVORA, IRETAMA E CARLÓPOLIS - NOVO FÓRUM PADRÃO 1500			PRAZO OK	
				ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 240.000,00		ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da licitação			INICIADO	
	Prazo estimado emissão Edital ao DP			maio, 2022	
	Prazo estimado publicação do Edital			maio, 2022	
	Prazo estimado homologação da licitação			junho, 2022	
	Prazo estimado emissão OES			julho, 2022	
	Fase ou localização atual DEA-AJ PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL				

5	MEDIANEIRA - PADRÃO 1800		Construção Fórum Novo	PRAZO OK	
				ALERTA	
	Valor máximo estimado licitação	R\$ 20.899,00		ATRASADO	
	Início do procedimento de preparação da licitação			junho, 2022	

Prazo estimado emissão Edital ao DP	julho, 2022
Prazo estimado publicação do Edital	julho, 2022
Prazo estimado homologação da licitação	agosto, 2022
Prazo estimado emissão OES	agosto, 2022
Fase ou localização atual EM ANÁLISE TERRENOS OFERTADOS A DOAÇÃO	

1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEEA

No período não foram elaborados projetos arquitetônicos específicos para obras novas e/ou estudos de viabilidade.

1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 13 TERRENOS

Conforme evidenciado na planilha de controle abaixo, não houve no mês do relatório alteração de *status* nas aquisições de imóveis da classe patrimonial terreno em curso, exceto pelo início do procedimento de oferta/vistoria de área na Comarca de Jaguapitã.

COMARCA	EXPEDIENTE	STATUS	OBSERVAÇÕES	MOV. SEI	
1	ALTO PARANÁ	0044842-67.2015	SUSPENSO. AGUARDA POSIÇÃO DA COMARCA	TERR. CONSIDERADO INADEQUADO. SUGERIDO COMARCA BUSCA DE NOVAS OPÇÕES AGUARDA POSICIONAMENTO DA COMARCA	7159920
2	MORRETES	0065613-61.2018	ELEITO	AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 11/2014	3296522
3	PIRAÍ DO SUL	0065866-15.2019	ELEITO	DESPACHO DE ELEIÇÃO ASSINADO, ENVIADO À COMARCA PARA FORMALIZAR DOAÇÃO JUNTAMENTE COM A PREFEITURA	7158450
4	CÂNDIDO DE ABREU	0017074-64.2018	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, AGUARDA ANÁLISE DA ARQUITETURA DESDE 07/2020	7398511
5	PARANAGUÁ	0083854-54.2016	ELEITO	AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 04/2018	2935335
6	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	0055920-19.2019	EM ANÁLISE	OFICIADA PREFEITURA PARA INFORMAR SE MANTÉM-SE A PROPOSTA DA DOAÇÃO.	7536035
7	CAPANEMA	0026468-61.2019	ELEITO	AGUARDANDO AVERBAÇÃO DA DOAÇÃO NA MATRÍCULA DESDE 11/2020 TRATATIVAS PARA PERMUTA SENDO REALIZADAS EM GRAU DE SECRETÁRIA DO TJPR AGUARDA INFORMAÇÃO DO DP	7084627
8	SENGÉS	0095784-64.2019	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA ANÁLISE DESDE 08/2020	5484053
9	SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ	0061298-53.2019	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA, NA ARQUITETURA PARA ANÁLISE DESDE 12/2020	5898310
10	PITANGA	0086215-39.2019	EM ANÁLISE	EMITIDO RELATÓRIO DE VISTORIA, A SER ENCAMINHADO À ARQUITETURA	7398458
11	MEDIANEIRA	0053483-05.2019	EM ANÁLISE	NA ENGENHARIA PARA VISTORIAR NOVA ÁREA OFERTADA	6651402

12	PIRAQUARA	0080776-47.2019	EM ANÁLISE	JÁ VISTORIADO PELA ENGENHARIA E PELA ARQUITETURA, AGUARDA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PELA DIREÇÃO DO FÓRUM (MATRÍCULA E OFÍCIO DOADOR)	6366887
13	JAGUAPITÃ	0075981-27.2021	EM ANÁLISE	ENCAMINHADO À DEA-DE PARA VISTORIA DAS ÁREAS OFERTADAS	7434878

1.1 TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS

No período, não houve alteração na planilha de terrenos doados e regularizados. Comarcas com **asteriscos** indicam que estão incluídas no PPA e LOA 2022.


	COMARCA	Ano doação	Ano limite
1	AMPÉRE (em construção) **	2015	2017
2	ANTONINA	2012	2015
3	CAMPO MOURÃO **	2019	2028
4	CAMPO MOURÃO (Usina Fotovoltáica) **	2019	2029
5	CARLÓPOLIS **	2011	2024
6	CENTENÁRIO DO SUL **	2009	Sem prazo
7	CLEVELÂNDIA **	2021	Sem prazo
8	COLOMBO **	2008	Sem prazo
9	CORBÉLIA **	2014	2024
10	FAXINAL **	2020	Sem prazo
11	FRANCISCO BELTRÃO (em construção)	2017	Sem prazo
12	IPORÃ **	2019	Sem prazo
13	IRATI **	2020	Sem prazo
14	IRETAMA **	2020	Sem prazo
15	JAGUARIAÍVA **	2010	Sem prazo
16	JANDAIA DO SUL **	2018	Sem prazo
17	JOAQUIM TÁVORA	2015	2022/2025
18	LAPA	2009	Sem prazo
19	LOANDA **	2019	2025
20	MANDAGUAÇÚ	2010	2012
21	MANGUEIRINHA **	2019	Sem prazo
22	MARIALVA **	2011	2024
23	MARINGÁ **	2012	2032+20
24	NOVA AURORA **	2017	Sem prazo
25	PARANAVAÍ **	2018	Sem prazo
26	PEABIRÚ **	2011	Sem prazo
27	PONTA GROSSA **	2013	Sem prazo

28	PONTAL DO PARANÁ **	2019	Sem prazo
29	PRUDENTÓPOLIS **	2020	Sem prazo
30	QUEDAS DO IGUAÇÚ **	2019	Sem prazo
31	RIBEIRÃO DO PINHAL **	2009	Sem prazo
32	ROLÂNDIA	1998	2000
33	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA **	2018	Sem prazo
34	SÃO JERÔNIMO DA SERRA **	2019	Sem prazo
35	SÃO MATEUS DO SUL **	2020	Sem prazo
36	SENGÉS	2011	2013
37	TELÊMACO BORBA	2011	Sem prazo
38	TERRA RICA **	2018	Sem prazo
39	UNIÃO DA VITÓRIA **	2016	2024
40	URAI **	2009	Sem prazo
41	WENCESLAU BRAZ **	2018	Sem prazo


2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR

RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO		EMIÇÃO
QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²)		03/05/2022
ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca)		899
NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento)		731
Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio		102
Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio		58
Idade média das construções (anos)		26,0
ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIBA)		321.490,24
ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO (fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses) (não inclui imóveis cedidos a 3º)		34.580,19
ÁREA TOTAL DE IMÓVEIS EM OUTROS USOS NÃO JUDICIÁRIOS OU SEM USO (cedidos a 3º e/ou sem uso)		34.367,38
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS (não inclui outras áreas cedidas a 3º, como casas de magistrados e outros imóveis de uso não judiciários)		390.437,81
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA (uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos)		193.034,93
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR		583.472,74
ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS		637.630,59
ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS EM USO NAS COMARCAS		128.193,64
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO EM CURITIBA		197.843,75
ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA		963.667,98
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS D		45 316.207,55
NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS		15 96.212,74
VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CONFORME SISTEMA HERMES		
VALOR PATRIMONIAL TERRENOS		R\$ 760.969.285,52
VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES		R\$ 1.094.521.932,45
VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR		R\$ 1.855.491.217,97
OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, e conforme Sistema Hermes		
NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR		
1. EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR		
	EM USO JUDICIÁRIO	SEM USO OU OUTROS USOS
FÓRUNS CENTRAIS	160	0
FÓRUNS ANTIGOS	2	46
IMÓVEIS 2	13	11
IMÓVEIS 3	8	4
IMÓVEIS 4	6	1
IMÓVEIS 5	4	0
IMÓVEIS 6	1	0
INTERIOR TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO A	194	C 62
obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não judiciário)		
2. EDIFICAÇÕES EM CURITIBA		
TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA B	36	
PRÓPRIOS (TJPR):	3	
PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ):	20	
LOCADOS AO TJPR:	13	
PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL):	2	
TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO (A+B)		230
TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO) (A+B+C)		292
TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS) (D)		45
TOTAL GERAL DE UNIDADES (A+B+C+D)		337

IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - PROPRIEDADE

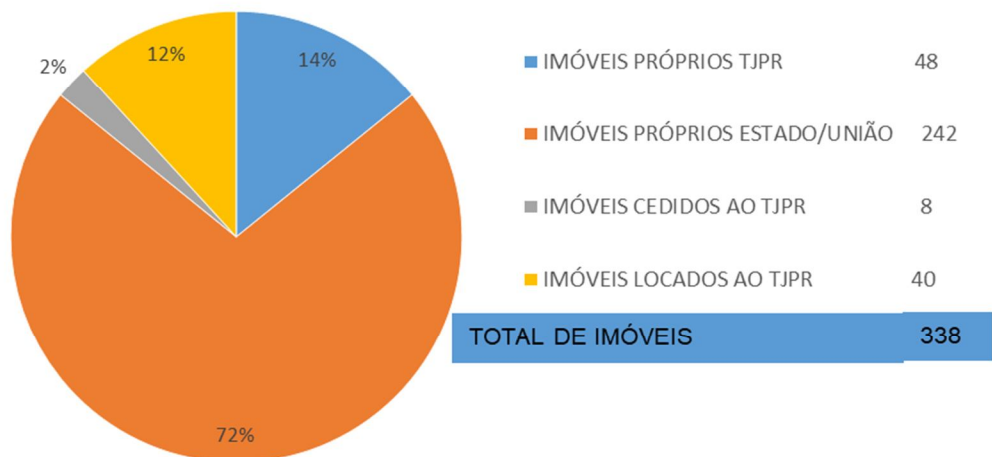

IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - USO

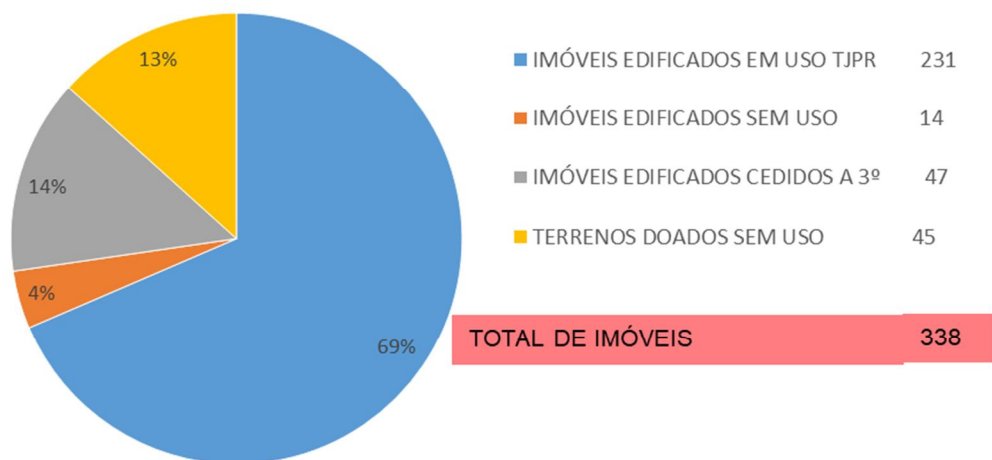

3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES)

Para maiores informações, ver Relatório de Ranqueamento do mês corrente.


Notas referenciais: mínimo 32 / máximo 2.648

RELATÓRIO RANQUEAMENTO DE COMARCAS RANQUEAMENTO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 114/2010 CNJ						EMIÇÃO 03/05/2022
POSIÇÃO RANQUEAMENTO	COMARCAS	NOTA REFERENCIAL	SITUAÇÃO DOMINIAL DO FÓRUM CENTRAL	HÁ OBRA/SERVIÇO EM ANDAMENTO?	HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO?	TERRENO DOADO?
1	NOVA AURORA	32	MUNICÍPIO	EM LICITAÇÃO NOVO FÓRUM TRP 7143748	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
2	AMPÉRE	35	MUNICÍPIO	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA	TERRENO DOADO
3	CENTENÁRIO DO SUL	50	MUNICÍPIO	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
4	COLOMBO	75	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO ARQUITETÔNICO DEA NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
5	JAGUARIAÍVA	84	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
6	MARINGÁ	118	ESTADO DO PARANÁ	EM PREPARAÇÃO LICITAÇÃO NOVO FÓRUM	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
7	BOCAIÚVA DO SUL	124	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	NÃO
8	PONTAL DO PARANÁ	156	MUNICÍPIO	EM PREPARAÇÃO LICITAÇÃO DA OBRA TRP 7527696	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
9	PARANAGUÁ	156	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	PROPOSTO
10	CORBÉLIA	160	ESTADO DO PARANÁ	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA	TERRENO DOADO
11	IRATI	164	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO	TERRENO DOADO
12	CLEVELÂNDIA	166	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
13	ANTONINA	176	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
14	MORRETES	183	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	PROPOSTO
15	PARANAÍ	183	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DEA NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO

16	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	184	TJPR	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
17	RIBEIRÃO DO PINHAL	190	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
18	PIRAÍ DO SUL	191	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	PROPOSTO
19	TELÊMACO BORBA	205	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DE A REFORMA E AMPLIAÇÃO	TERRENO DOADO
20	FRANCISCO BELTRÃO	213	ESTADO DO PARANÁ	EM OBRA NOVO FÓRUM	NADA CONSTA	TERRENO DOADO
21	PIRAQUARA	213	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	EXECUTIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO	PROPOSTO
22	SENGÉS	221	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
23	URAI	221	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
24	UNIÃO DA VITÓRIA	225	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DE A NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
25	PEABIRÚ	232	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO
26	PITANGA	236	ESTADO DO PARANÁ	REFORMA	NADA CONSTA	TERRENO DOADO
27	JAGUAPITÃ	238	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	PROPOSTO
28	JANDAIA DO SUL	240	ESTADO DO PARANÁ	REFORMA	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
29	MANDAGUARÍ	242	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NÃO
30	SARANDI	254	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO DE A REFORMA E AMPLIAÇÃO	NÃO

31	SÃO JOÃO DO TRIUNFO	261	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NÃO
32	TEIXEIRA SOARES	268	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NÃO
33	CÂNDIDO DE ABREU	276	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	PROPOSTO
34	PRUDENTÓPOLIS	281	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
35	SANTA MARIANA	282	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NÃO
36	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	282	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	PROJETO ARQUITETÔNICO DE A REFORMA E AMPLIAÇÃO	PROPOSTO
37	MANDAGUAÇÚ	293	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
38	MARIALVA	296	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	EXECUTIVO NOVO FÓRUM	TERRENO DOADO
39	PRIMEIRO DE MAIO	300	ESTADO DO PARANÁ	REPAROS	NADA CONSTA	NÃO
40	IPORÃ	302	ESTADO DO PARANÁ	NADA CONSTA	PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II	TERRENO DOADO

4. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

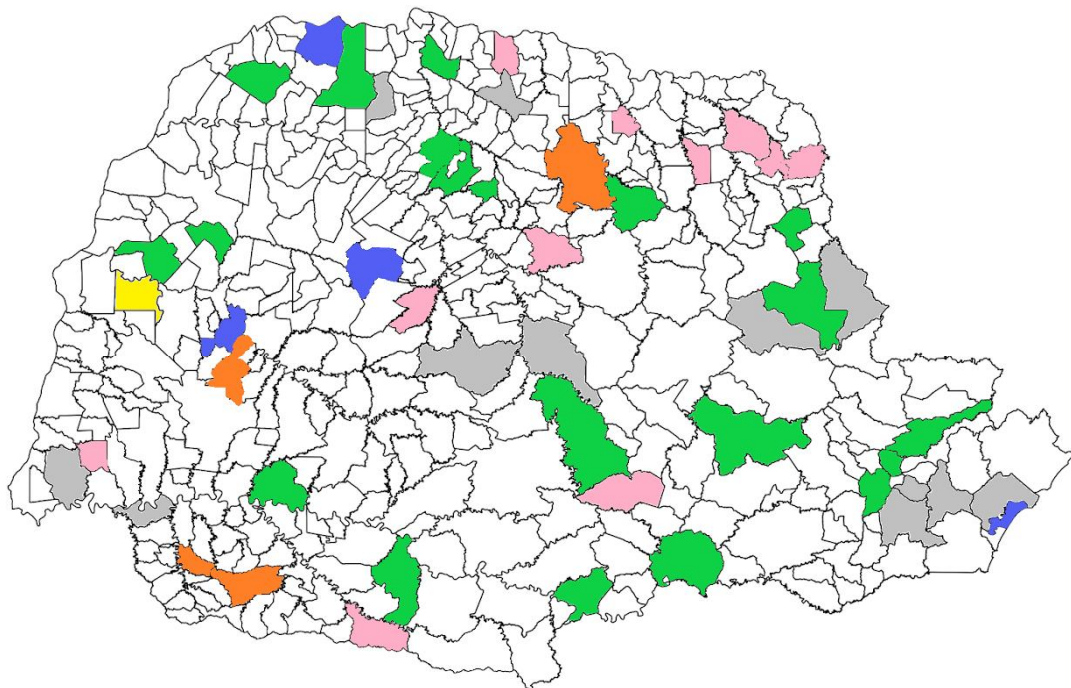

Obras em andamento
Londrina – Construção Bloco Fórum Criminal
Ampére – Construção Novo Fórum
Francisco Beltrão – Construção Novo Fórum
Corbélia – Construção Novo Fórum

Obras em recebimento
Bela Vista do Paraíso – Construção Novo Fórum
Curitiba – Sonorização plenário Anexo

Obras em licitação ou preparação de edital
Campo Mourão – Novo Fórum
Nova Aurora – Novo Fórum
Terra Rica – Novo Fórum
Pontal do Paraná – Novo Fórum

Projetos complementares contratados
Maringá – Projetos e Assessoramento – em recebimento
Curitiba – Centro Judiciário – Projetos e Assessoramento CJC
Colombo – Projetos e Assessoramento Novo Fórum
Ponta Grossa – Projetos e Assessoramento Novo Fórum
Paranavaí e União da Vitória – Projetos Novo Fórum
Curitiba – Prédio Anexo – Ar cond. central – Projetos - suspenso
Curitiba – Sede Mauá – Ar cond. central – Projetos - suspenso
Jaguariaíva, Bocaiúva do Sul, Peabiru, Iporã, São Jerônimo da Serra, Mangueirinha, Wenceslau Braz – Projetos Novo Fórum
Jandaia do Sul, Quedas do Iguaçu, Colorado, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Loanda, Marialva – Projetos Novo Fórum
Campo Mourão – Usina Fotovoltaica – Projetos

Projetos complementares em contratação/preparação
Santo Antônio da Platina e Irati – Projetos Novo Fórum
Curitiba Sede Mauá – Usina Fotovoltaica
Centenário do Sul, Ribeirão do Pinhal, Clevelândia, Uraí, Faxinal, Joaquim Távora, Iretama, Carlópolis
Medianeira – Projetos Novo Fórum

Projetos Arquitetônicos e Estudos de Viabilidade

Terrenos em análise ou legalização de doação
Alto Paraná
Morretes
Piraí do Sul
Cândido de Abreu
Paranaguá
São José dos Pinhais
Capanema
Sengés
São Miguel do Iguacú
Pitanga
Medianeira
Piraquara
Jaguapitã

5. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 15 AÇÕES

No período do relatório mantém-se em Recebimento Provisório as obras de:

- Pleno do Palácio da Justiça
- Santa Helena
- Loanda

Conforme evidenciado na planilha de controle a seguir, houve no mês do relatório alteração de *status* nas ações, obras e serviços de acessibilidade indicadas em amarelo.


PLANO E OBRAS DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE COMARCAS ASSINALADAS POR DEA-DAR PARA DEA-DE PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE COR AMARELA INDICA ALTERAÇÃO DESDE O ÚLTIMO RELATÓRIO COR CINZA INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO COR AZUL INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO COR ROXA INDICA OBRA QUE INCLUI EXECUÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL				
	COMARCA	STATUS	OES	Observações
1	Almirante Tamandaré	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		29/03/2022 Com DAR para esclarecimento quanto ao projeto 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação
2	Capanema	SOB ANÁLISE DA DM		16/07/2021, enviado para análise da DM 21/06/2021, Com DE para levantamento e contratação
3	Curitiba - Descentralizado Sta Felicidade	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	06/11/2019	08/04/2022 Formalizado novo aditivo de preço e prazo com mais 45 dias para finalização 18/02/2022 Formalizado novo aditivo
4	Curitiba - Tribunal do Juri	CONTRATADO - EM EXECUÇÃO	29/10/2020	15/03/2022 Formalizado aditivo de preço e prazo (30 dias) 14/02/2022 Em análise aditivo de preço e prazo (30 dias)
5	Curitiba - Tribunal Pleno 12º andar Anexo	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6341494	22/07/2020	09/04/2021 Recebimento provisório 6341494 26/02/2021 Autorizado 3º aditivo de prazo em mais 30 dias
6	Faxinal	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		08/02/2021 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado - com DE para contratação
7	Imbituva	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/06 Com DE para levantamento e contratação
8	Loanda	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 7479169	06/07/2021	23/03/2022 Recebimento provisório 7479169 10/02/2022 Formalizado termo aditivo de preço e prazo, concedido mais 60 dias para finalização

9	Mangueirinha	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação
10	Morretes	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		28/09/2020 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado
11	Quedas do Iguaçu	EM ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA		12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação
12	Ribeirão Claro	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		24/03/2021 Com DE para contratação 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto
13	Santa Helena	COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6016209	01/07/2020	26/01/2021 Recebimento Provisório 6016209 09/07/2020 Reforma contratada OS emitida 180 dias
14	União da Vitória - Fórum Central	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		12/02/2020 Submetido à comarca para análise em 12/2019
15	São Jerônimo da Serra	ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO		03/12/2020 Enviado ao fiscal da regional para contratação 03/12/2020 Finalizado projeto de arquitetura




6. DESEMBOLSOS TOTAIS

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de R\$ 8.626.674,82 correspondentes a 29,84 % do valor inicialmente planejado de R\$ 28.906.997,56 para o mês, desembolsos estes segundo as seguintes classes:

	Desembolso no mês do relatório	Desembolso acumulado no ano
Obras em execução ou em Recebimento	R\$ 4.898.554,46	R\$ 7.708.419,74
Proj. complementares	R\$ 0,00	R\$ 59.865,02
Manutenção e Atas	R\$ 3.728.120,36	R\$ 9.589.764,18
ACUMULADO ANUAL	R\$ 8.626.674,82	R\$ 17.358.048,94

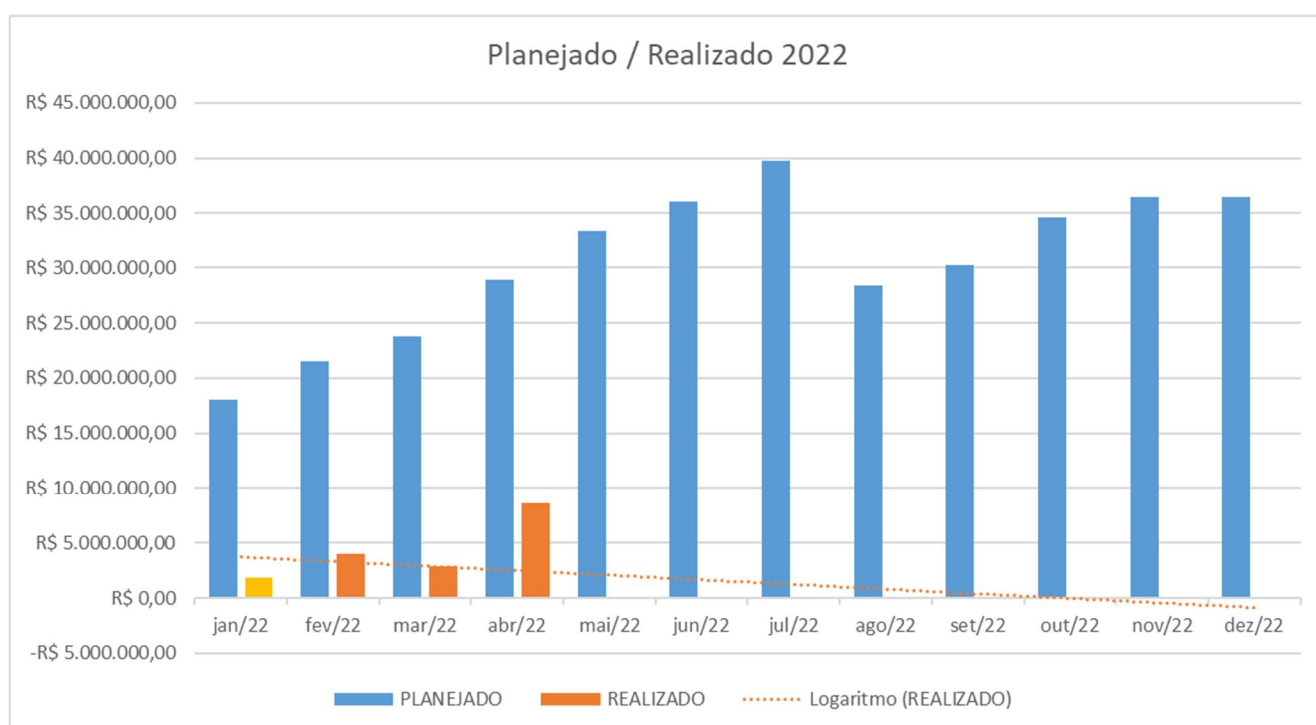

6.1 EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (medido até o mês do Relatório)

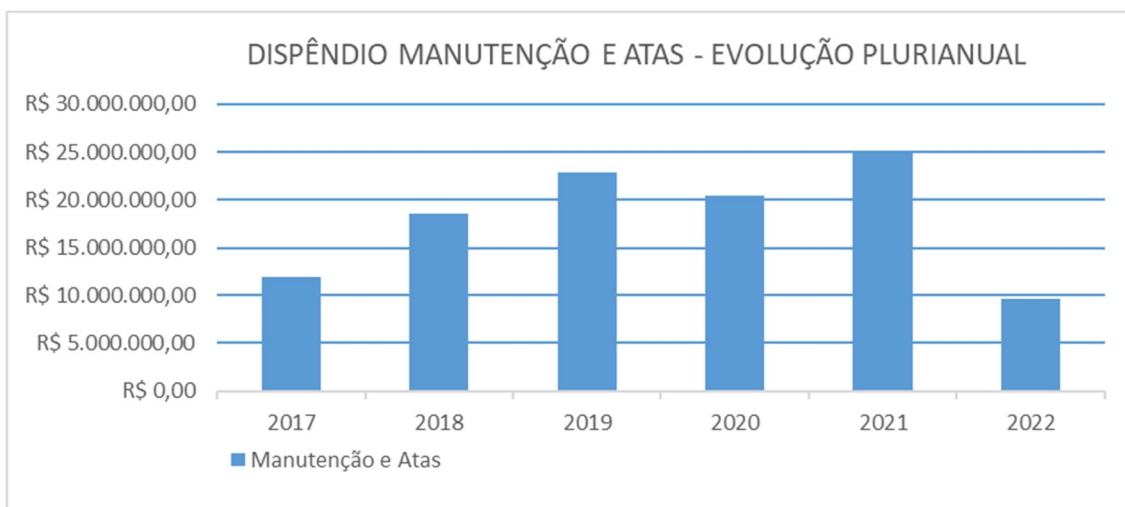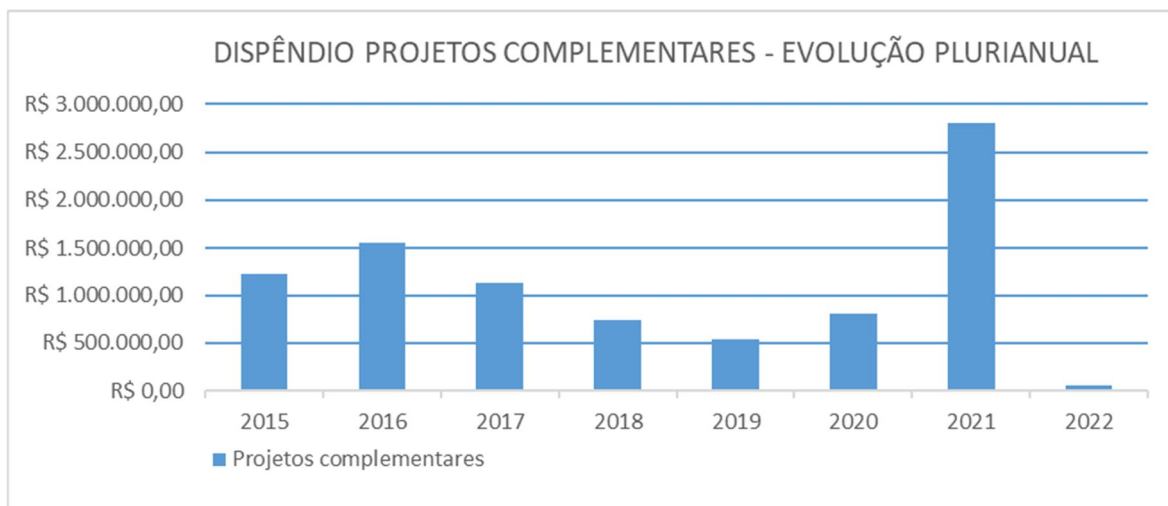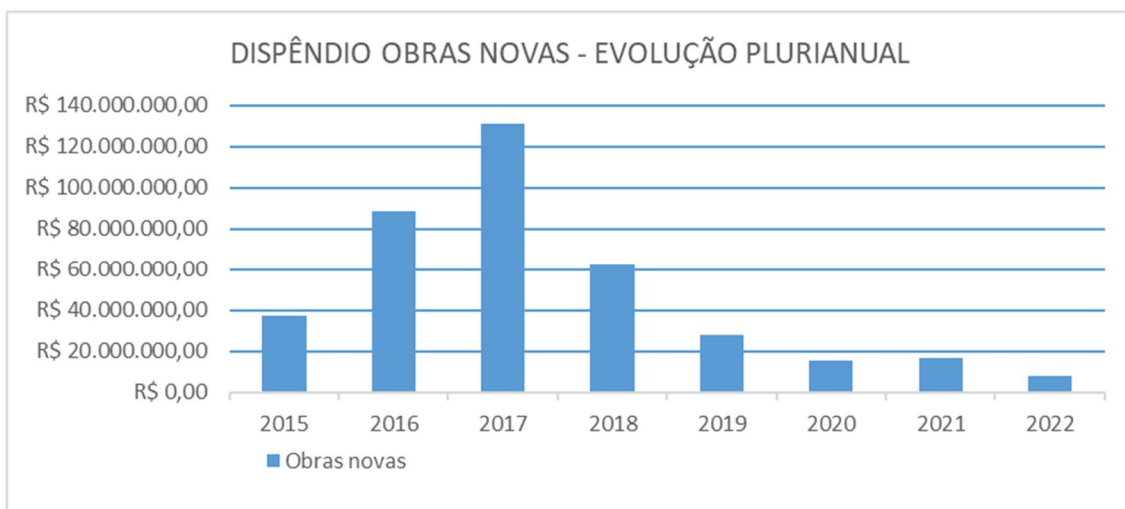

7. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES

7.1 Manutenção Elevadores

7.2 Manutenção Ar condicionado

7.3 Manutenção Geradores

7.4 Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato)


7.5 Manutenção Sala Segura e Data Center

7.6 Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia

7.7 Ata de Instalação de Ar condicionado

7.8 Demais contratações eventuais em regime de dispensa e lâmpadas LED

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor de R\$ 3.728.120,36 e acumulado anual de R\$ 9.589.764,18, sendo que estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo:

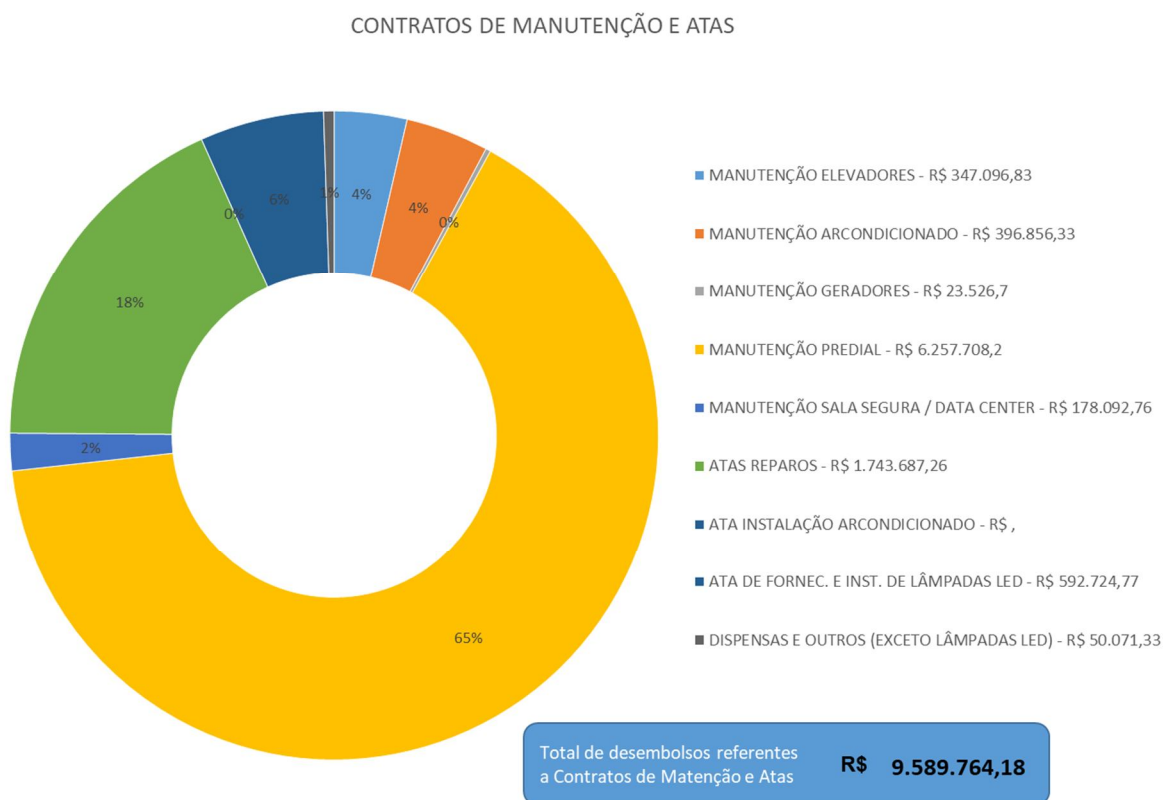

DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS:

As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção face a próximo esgotamento da vigência do contrato: **verde** (não necessita atenção), **amarelo** (final da vigência próximo) e **vermelho** (contrato vencido).


7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada.

Regional	Contratado	Vigência	Valor contrato
Regional Leste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2022	R\$ 481.501,56
Regional Oeste	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	13/10/2022	R\$ 117.597,36
Regional Norte	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	03/05/2022	R\$ 140.515,56.

Para unidades atendidas por regional – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 182.632,13
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 347.096,83

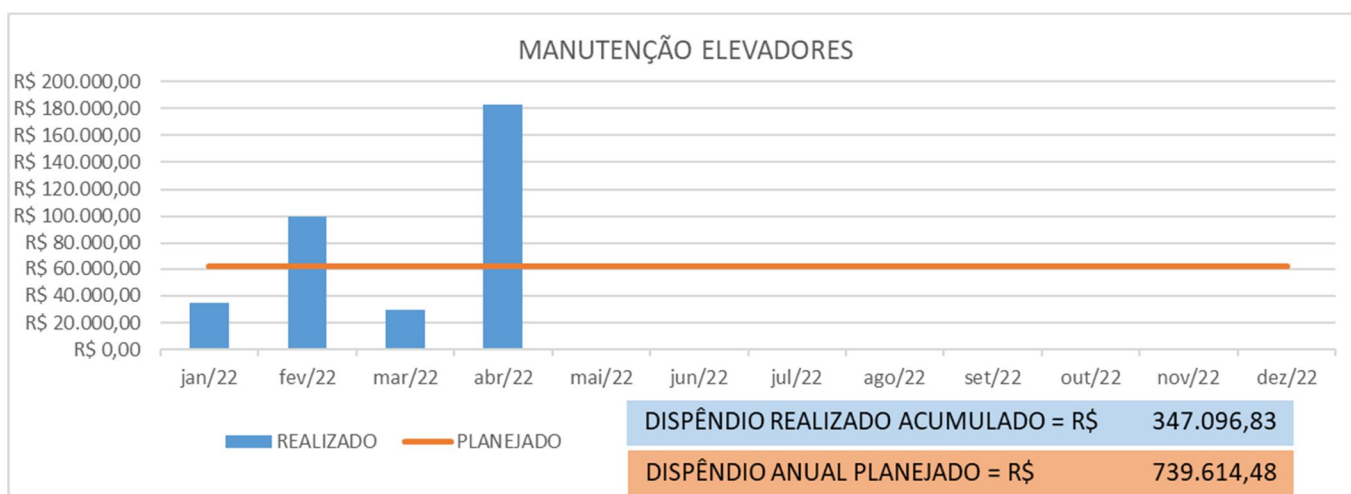


Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Regional Leste	Dados não informados		
Regional Leste	Dados não informados		
Regional Norte	Dados não informados		

7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados em prédios do tribunal de justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná total	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	08/02/2023	R\$ 5.759.707,44
Para unidades atendidas – ver ANEXO I			
Desembolso no período do Relatório			R\$ 396.856,33
Desembolso acumulado no ano do Relatório			R\$ 396.856,33

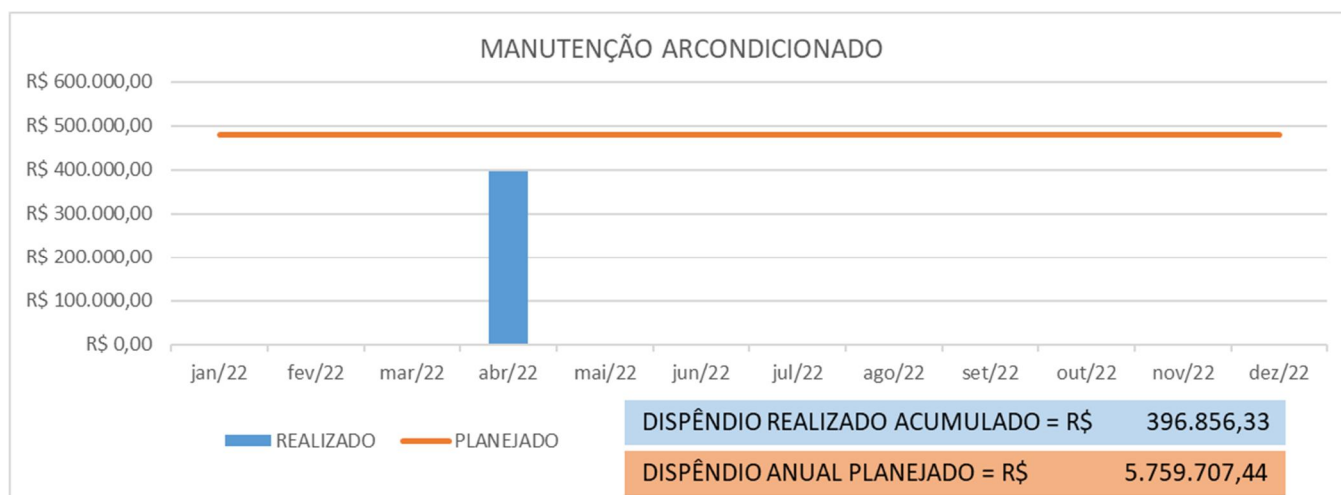


Destino	Total de chamados	Finalizados	Abertos
Paraná total			
Chamados finalizados totais no mês (incluem chamados abertos em outros meses e finalizados no mês do relatório)		Dados não informados	

7.3 MANUTENÇÃO GERADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paran , com fornecimento integral de pe as.

Destino	Contratado	Vig�ncia	Valor contrato
Paran� total	EFL SILVA MANUTEN�O DE NO-BREAKS E GERADORES - ME	12/08/2022	R\$ 294.166,48
Para unidades atendidas – ver ANEXO I			
Desembolso no per�odo do Relat�rio			R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relat�rio			R\$ 23.526,70

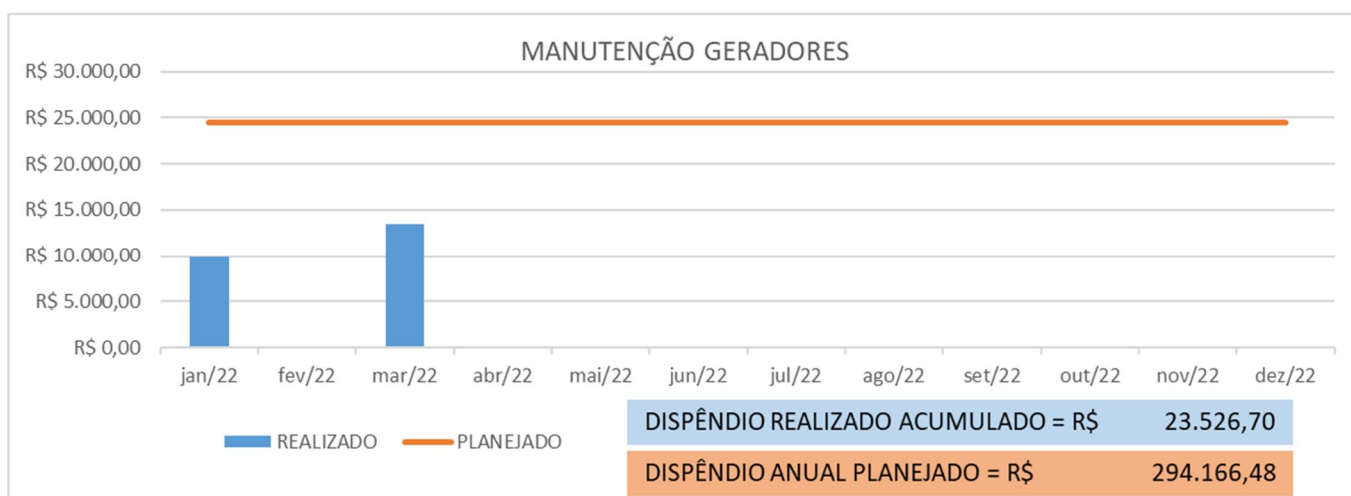

Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Paran� total	Dados n�o informados		

7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de materiais e insumos, para a realização dos serviços.


Contrato sob gestão do Departamento do Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção do DEA a fiscal do contrato.

Para relação das unidades por Regionais, ver Anexos.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Paraná	EQS ENGENHARIA S.A.	01/04/2022	R\$ 12.097.078,36

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 2.786.525,28
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 6.257.708,20

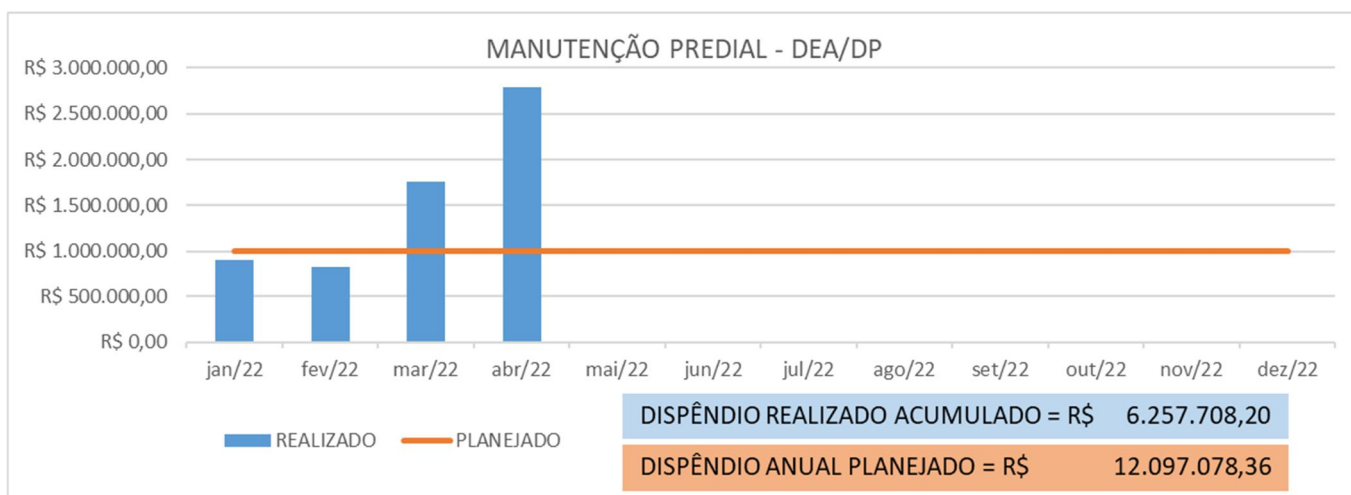

TOTAL DE SERVIÇOS (mês de referência fevereiro/2022 fornecidos por DEA-DM)

Relação das unidades do contrato (exceto Regional 1)

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
CAMPO MOURÃO	Atestado	R\$ 3.065,07
CASCABEL	Atestado	R\$ 7.804,03
CORNÉLIO PROCÓPIO	Atestado	R\$ 2.396,73
CRUZEIRO DO OESTE	Atestado	R\$ 7.389,79
FOZ DO IGUAÇU	Atestado	R\$ 103,12
GUARAPUAVA	Atestado	R\$ 14.508,15
LONDRINA	Atestado	R\$ 12.259,66
MARINGÁ	Atestado	R\$ 10.796,09
PATO BRANCO	Atestado	R\$ 4.142,30
PONTA GROSSA	Atestado	R\$ 2.279,05
RIBEIRÃO CLARO	Atestado	R\$ 1.604,39
TELÉMADO BORBA	Atestado	R\$ 1.768,38
UNIÃO DA VITÓRIA	Atestado	R\$ 1.732,15
13 UNIDADES	TOTAL:	R\$ 69.848,90

Relação das Cidades (exceto Regional 1)

UNIDADES	SITUAÇÃO	VALOR ATESTADO
Alto Piquiri	Atestado	R\$ 642,37
Apucarana	Atestado	R\$ 755,09
Arapongas	Atestado	R\$ 139,96
Assaí	Atestado	R\$ 2.013,93
Assis Chateaubriand	Atestado	R\$ 1.029,14
Barracão	Atestado	R\$ 274,26
Bela Vista do Paraíso	Atestado	R\$ 260,34
Cambará	Atestado	R\$ 1.084,67
Campina da Lagoa	Atestado	R\$ 203,86
Cantagalo	Atestado	R\$ 627,20
Capanema	Atestado	R\$ 270,52
Capitão Leônidas Marques	Atestado	R\$ 628,08
Cascavel	Atestado	R\$ 4.793,38
Castro	Atestado	R\$ 470,34
Catanduvas	Atestado	R\$ 31,35
Cianorte	Atestado	R\$ 984,81
Cidade Gaúcha	Atestado	R\$ 335,00
Colorado	Atestado	R\$ 296,06
Congonhinhas	Atestado	R\$ 510,21
Cornélio Procópio	Atestado	R\$ 1.312,06
Coronel Vivida	Atestado	R\$ 266,22
Dois Vizinhos	Atestado	R\$ 401,18
Engenheiro Beltrão	Atestado	R\$ 905,15
Formosa do Oeste	Atestado	R\$ 2.159,69
Foz do Iguaçu	Atestado	R\$ 103,12
Francisco Beltrão	Atestado	R\$ 600,56
Goioerê	Atestado	R\$ 1.164,87
Grandes Rios	Atestado	R\$ 6,92
Guaraniaçu	Atestado	R\$ 555,89
Guarapuava	Atestado	R\$ 10.184,37
Ibiporã	Atestado	R\$ 896,48
Icaraíma	Atestado	R\$ 312,99
Ipiranga	Atestado	R\$ 160,93
Irati	Atestado	R\$ 797,48
Ivaiporã	Atestado	R\$ 434,85
Jacarezinho	Atestado	R\$ 508,29
Jaguaiáiva	Atestado	R\$ 74,73
Jaguapitã	Atestado	R\$ 167,01
Jandaia do Sul	Atestado	R\$ 662,13
Loanda	Atestado	R\$ 344,39
Londrina	Atestado	R\$ 2.554,88
Mallet	Atestado	R\$ 677,95
Marechal Cândido Rondon	Atestado	R\$ 321,60
Marialva	Atestado	R\$ 742,55
Marilândia do Sul	Atestado	R\$ 200,40
Maringá	Atestado	R\$ 3.954,28
Matelândia	Atestado	R\$ 91,38
Nova Aurora	Atestado	R\$ 207,91
Nova Esperança	Atestado	R\$ 127,37

Nova Londrina	Atestado	R\$ 316,62
Ortigueira	Atestado	R\$ 292,97
Palmas	Atestado	R\$ 421,39
Palmital	Atestado	R\$ 1.022,24
Palotina	Atestado	R\$ 231,56
Paraíso do Norte	Atestado	R\$ 582,62
Pitanga	Atestado	R\$ 443,39
Ponta Grossa	Atestado	R\$ 856,45
Porecatu	Atestado	R\$ 5.170,95
Prudentópolis	Atestado	R\$ 1.058,13
Quedas do Iguaçu	Atestado	R\$ 544,53
Rebouças	Atestado	R\$ 375,34
Reserva	Atestado	R\$ 215,80
Rolândia	Atestado	R\$ 93,70
Santa Fé	Atestado	R\$ 933,70
Santa Helena	Atestado	R\$ 359,38
Santo Antônio do Sudoeste	Atestado	R\$ 182,91
Santo Antônio da Platina	Atestado	R\$ 507,72
São João	Atestado	R\$ 1.995,78
São João do Ivaí	Atestado	R\$ 536,40
São João do Triunfo	Atestado	R\$ 146,88
Sarandi	Atestado	R\$ 1.332,52
Sengés	Atestado	R\$ 38,65
Siqueira Campos	Atestado	R\$ 185,69
Teixeira Soares	Atestado	R\$ 220,32
Telêmaco Borba	Atestado	R\$ 193,97
Terra Rica	Atestado	R\$ 2.086,47
Terra Roxa	Atestado	R\$ 189,83
Tibagi	Atestado	R\$ 555,43
Tomazina	Atestado	R\$ 162,88
Umuarama	Atestado	R\$ 615,77
União da Vitória	Atestado	R\$ 1.364,95
Wenceslau Braz	Atestado	R\$ 239,81
Xambê	Atestado	R\$ 125,95
83 CIDADES	TOTAL:	R\$ 69.848,90

Para maiores informações, ver Relatórios Divisionais da Divisão de Manutenção

Relatório Regional 1

Período considerado - Contrato EQS Engenharia – fevereiro/2022

CIDADE	VALOR APROVADO
Almirante Tamandaré	R\$ 2.606,69
Antonina	-
Araucária	R\$ 120,47
Bocaiúva Do Sul	R\$ 150,34
Campina Grande Do Sul	R\$ 102,41
Campo Largo	R\$ 1.333,48
Cerro Azul	-
Colombo	R\$ 103,37

Curitiba	R\$ 67.022,87
Fazenda Rio Grande	R\$ 2.519,31
Guaratuba	-
Lapa	R\$ 891,26
Matinhos	
Morretes	
Paranaguá	R\$ 7.084,57
Pinhais	R\$ 2.592,73
Piraquara	R\$ 892,80
Pontal Do Paraná	R\$ 2.517,48
Rio Branco do Sul	R\$ 632,88
Rio Negro	R\$ 1.378,04
São José dos Pinhais	R\$ 8.712,35
TOTAL MEDIÇÃO	R\$ 98.661,05
TOTAL ACUMULADO CONTRATO	R\$ 550.398,00
TOTAL ACUMULADO 2022*	R\$ 214.800,97

212 Ordens de Serviço do tipo Corretivas foram atendidas de 01/02/2022 à 28/02/2022
31 Ordens de Serviço do tipo Preventivas foram atendidas de 01/02/2022 à 28/02/2022.

PROGRAMAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA – FEV/2022 (exceto Regional 1)

DADOS NÃO FORNECIDOS.

7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER


Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Álvaro Ramos	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	22/07/2022	R\$ 444.998,13

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça.

Destino	Contratado	Vigência	Valor contrato
Sede Prédio Anexo	VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA	01/04/2022	R\$ 547.800,00

Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2)	R\$ 30.750,58
Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2)	R\$ 178.092,76

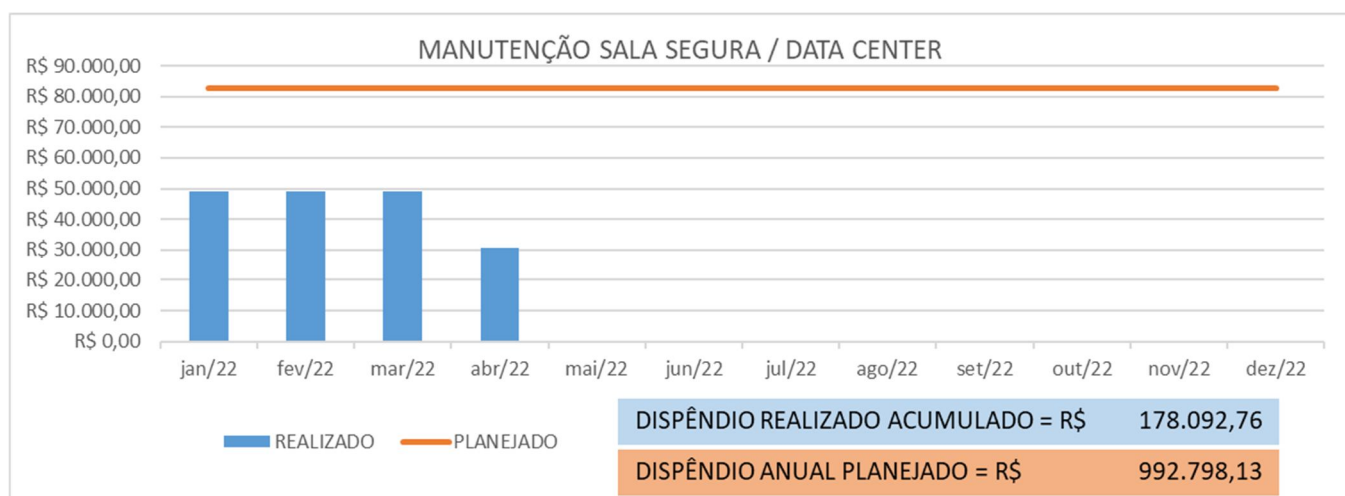


7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, reparos, adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas comarcas componentes das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, Francisco Beltrão, Londrina, Jacarezinho, Umuarama, Ponta Grossa, Maringá e Curitiba.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Regional Guarapuava	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	03/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional RMC e Litoral	JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP	03/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Cascavel	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	21/09/2021	R\$ 1.000.000,00
Regional Francisco Beltrão	CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA	12/11/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Londrina	CONSTRUTORA DOTTO LTDA	01/12/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Jacarezinho	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	04/08/2022	R\$ 1.000.000,00
Regional Umuarama	CONSTRUTORA DOTTO LTDA	29/09/2022	R\$ 1.500.000,00
Regional Ponta Grossa	JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP	04/08/2022	R\$ 2.000.000,00
Regional Maringá	COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03/05/2023	R\$ 1.000.000,00
Regional Curitiba	TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	25/03/2023	R\$ 1.500.000,00

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório	R\$ 323.865,79
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 1.743.687,26

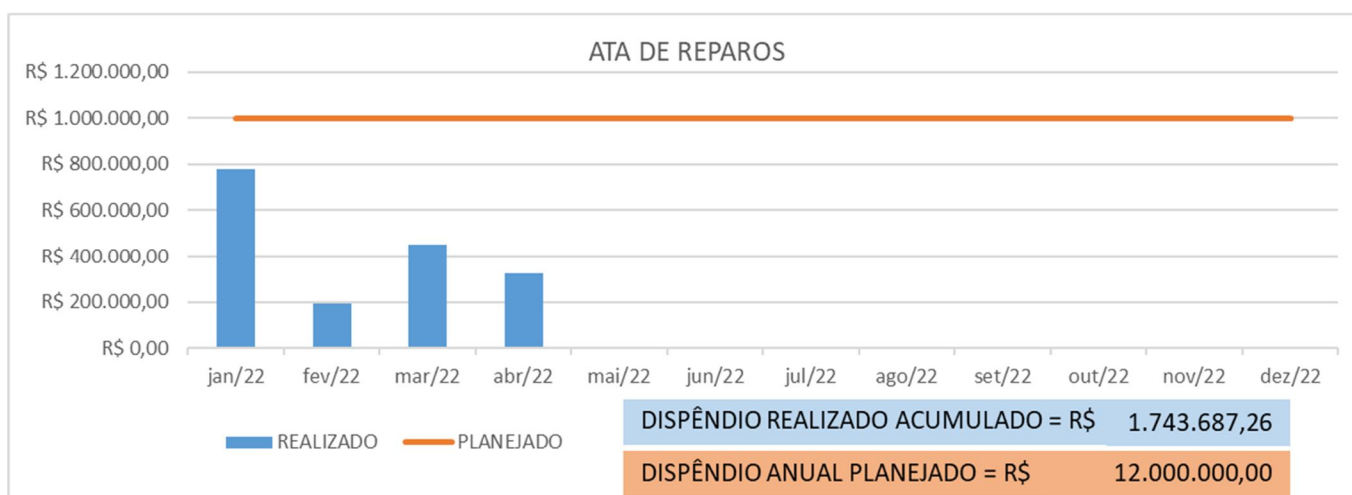

CONTRATOS/OBRAS EM EXECUÇÃO DE REPAROS DA DIVISÃO DE ENGENHARIA

OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ATUALIZADO	VALOR MEDIDO	DATA FINAL
SANTO ANTONIO DA PLATINA - SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ 62.924,91	O MESMO	R\$ 62.924,91	20/01/2022
COPEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	R\$ 3.400.089,00	R\$ 3.375.421,95	R\$ 1.603.037,12	10/09/2022
CTBA JE STA FELICIDADE - REPAROS	R\$ 891.205,00	R\$ 1.071.041,76	R\$ 1.071.041,76	20/05/2022
MORRETES - CFTV	R\$ 75.389,96	O MESMO	ZERO	10/07/2022
CTBA JE BOQUEIRÃO - REPAROS	R\$ 137.171,54	O MESMO	ZERO	15/04/2022
LONDRINA - CONSTRUÇÃO F CRIMINAL	R\$ 48.621.777,84	R\$ 49.590.234,95	R\$ 18.391.705,47	26/06/2022
MARINGÁ - REPAROS	R\$ 98.672,33	O MESMO	ZERO	14/06/2022
CTBA - PERY MOREIRA - REFORMA	R\$ 2.499.345,89	R\$ 2.956.286,43	R\$ 2.895.771,44	04/05/2022
CURITIBA TRIB DO JÚRI - REPAROS	R\$ 285.837,60	O MESMO	R\$ 236.533,88	13/04/2022
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CFTV	R\$ 140.572,97	O MESMO	ZERO	26/05/2022
IPIRANGA - REPAROS	R\$ 17.874,20	O MESMO	ZERO	17/06/2022
MAIS DE UMA - MANUTENÇÃO GERADORES	R\$ 81.055,56	O MESMO	R\$ 50.545,22	18/08/2022
CTBA PERY MOREIRA - REFORMA	R\$ 2.499.345,89	R\$ 2.956.286,43	2895771,44	04/05/2022
CURITIBA PALÁCIO - SONORIZAÇÃO E VIDEOCONF	R\$ 4.749.203,43	R\$ 4.955.883,05	R\$ 4.794.100,77	26/02/2022
CTBA JE STA FELICIDADE - ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 74.099,64	R\$ 74.099,64		14/04/2022
LOANDA - REFORMA	R\$ 189.980,76	R\$ 224.243,31	R\$ 224.243,31	16/03/2022
MANDAGUARI - REPAROS	R\$ 97.124,29	O MESMO	ZERO	01/06/2022
CTBA VEP - REPAROS	R\$ 357.439,84	R\$ 499.610,62	R\$ 499.610,62	03/03/2022
PALÁCIO DA JUSTIÇA - ATELIER DE INOVAÇÃO	R\$ 9.752,74	R\$ 3.434,49	R\$ 3.434,49	14/02/2022
JAGUAPITÃ - REPAROS - CFTV	R\$ 60.067,47	O MESMO	R\$ 60.067,47	10/05/2022
FRANCISCO BELTRÃO - CONSTRUÇÃO	R\$ 35.555.555,55	R\$ 35.728.091,34	R\$ 7.825.896,74	04/08/2022
CTBA SALA COFRE - MANUTENÇÃO	R\$ 444.998,13	R\$ 425.946,48	R\$ 276.755,26	27/07/2022
PORECATU - REFORMA	R\$ 99.970,73	R\$ 143.750,89	R\$ 143.750,89	19/03/2022
SALA SEGURA - PRÉDIO ANEXO	R\$ 273.900,00	ATÍPICO VERIFICAR	R\$ 220.361,76	01/04/2023
CTBA MAUA - MANUT SUBESTAÇÃO	R\$ 9.599,00	O MESMO	ZERO	05/06/2022

CORBBÉLIA - CONSTRUÇÃO	R\$ 9.378.308,06	O MESMO	R\$ 333.183,95	29/12/2022
CTBA - PALÁCIO DA JUSTIÇA BIBLIOTECA	R\$ 97.061,96	O MESMO	ZERO	13/05/2022
MAIS DE UMA - MEDIÇÃO E TREINAMENTO COPEL	R\$ 123.000,00	O MESMO	R\$ 68.374,83	02/02/2022
SARANDI - REPAROS	R\$ 98.869,97	O MESMO	ZERO	14/06/2022
CASCAVEL - REPAROS	R\$ 165.122,89	O MESMO	R\$ 108.755,49	14/03/2022
PARANAÍ - REPAROS	R\$ 85.151,61	O MESMO	ZERO	14/06/2022
LOANDA - CFTV INÍCIO DE OBRA	R\$ 60.067,47	O MESMO	R\$ 60.067,47	10/04/2022
TERRA RICA - CFTV E SONORIZAÇÃO	R\$ 46.170,21	O MESMO	R\$ 46.170,21	16/04/2022
CORNELIO PROCOPIO - LAUDO	R\$ 10.000,00	O MESMO	ZERO	24/03/2022
JANDAIA DO SUL - REPAROS	R\$ 71.723,13	O MESMO	R\$ 34.021,44	15/05/2022
ARAUCÁRIA - REPAROS	R\$ 95.968,44	O MESMO	R\$ 63.543,76	15/06/2022
SANTA FÉ - CFTV	R\$ 99.994,63	O MESMO	R\$ 99.994,63	19/02/2022
ALTÔNIA - REPAROS	R\$ 161.230,95	O MESMO	ZERO	16/08/2022
PONTAL DO PARANÁ - REPAROS	R\$ 81.998,30	O MESMO	ZERO	10/06/2022
CURIÚVA - SONORIZAÇÃO E CFTV	R\$ 85.611,19	O MESMO	ZERO	02/05/2022
PIRAÍ DO SUL - REPAROS	R\$ 203.955,31	O MESMO	ZERO	02/08/2022
SANTA HELENA- SONORIZAÇÃO	R\$ 22.360,72	O MESMO	ZERO	04/07/2022
FRANCISCO BELTRÃO - PROJETO ISOL ACÚSTICO	R\$ 3.520,60	O MESMO	ZERO	17/06/2022
GOIOERÊ - MANUT TRANSFORMADOR	R\$ 11.500,00	O MESMO	ZERO	10/07/2022


7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do estado do paraná.

Destino	Contratado	Vigência	Valor máximo
Paraná total	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA -EPP	11/08/2021	R\$ VENCIDO

Contrato Paraná total: encontra-se em andamento procedimento licitatório para nova contratação (0067526-73.2021.8.16.6000), encontrando-se atualmente em fase de análise documental da concorrente arrematante.

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 0,00

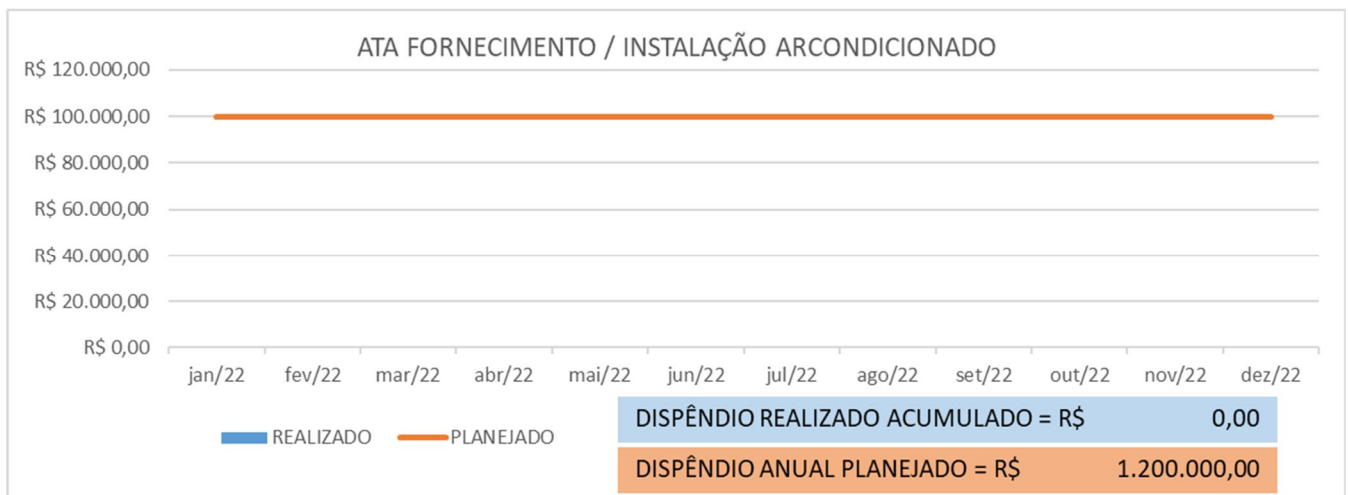


Destino	Total atendimentos	Finalizados	Abertos
Paraná total	Dados não informados		

7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED


Destino/objeto	Contratado	Vigência	Valor contratado
ESTADO – instalação lâmpadas LED	CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA EPP	26/02/2025	R\$ 3.511.099,85

Desembolso no período do Relatório	R\$ 0,00
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 592.724,77
Desembolso acumulado total do contrato até o momento	R\$ 1.603.037,83

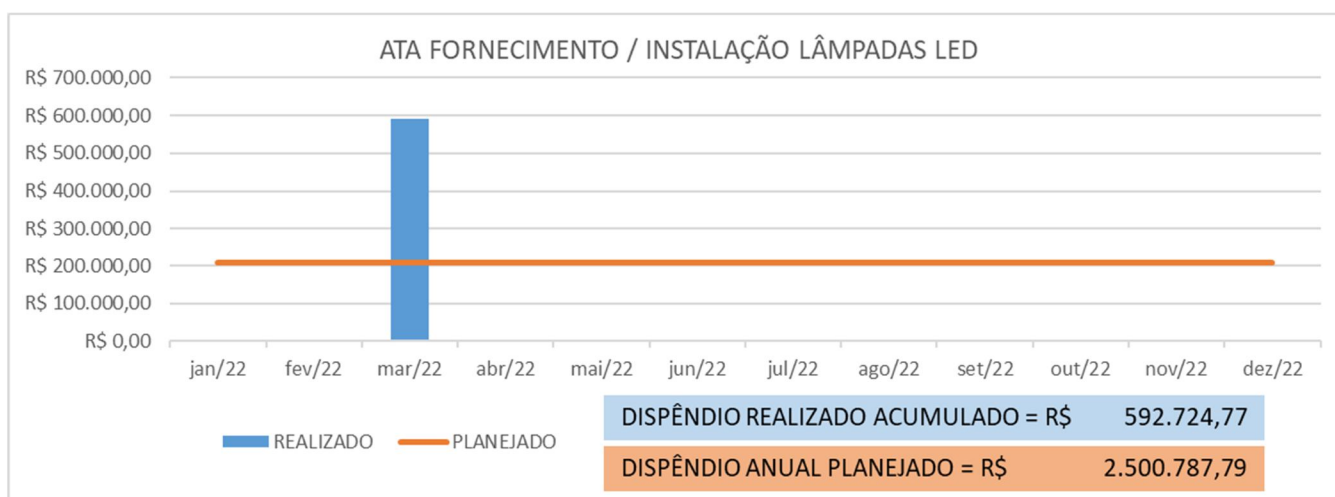

Demais contratações em regime de dispensa:

Desembolso no período do Relatório	R\$ 7.490,25
Desembolso acumulado no ano do Relatório	R\$ 50.071,33

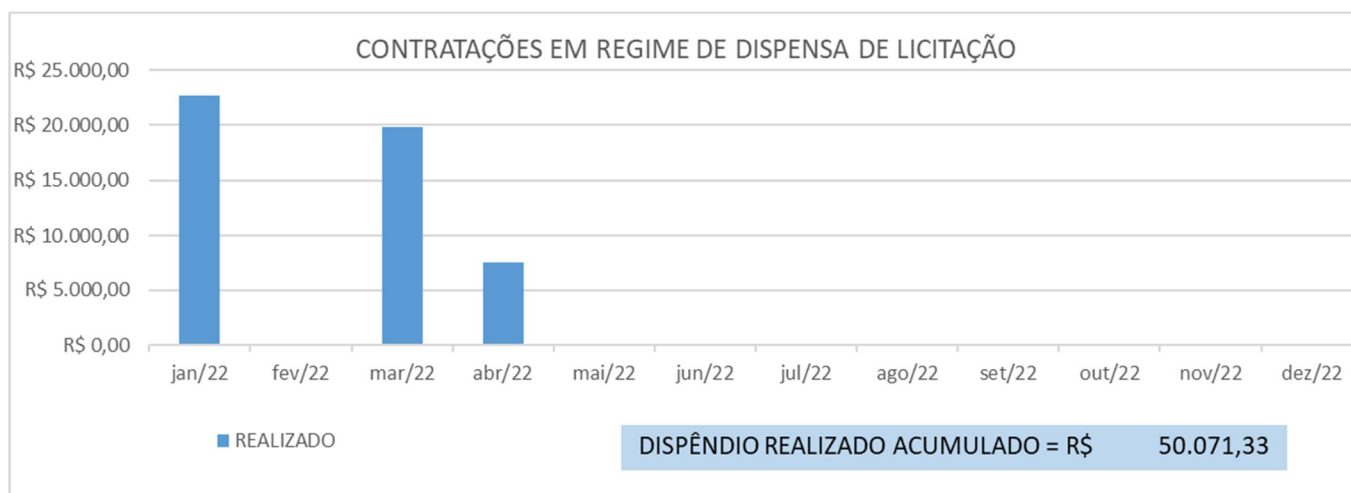

8.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS**REGIONAL LESTE – UNIDADES ATENDIDAS**

Almirante tamandaré
Campina grande do sul
Campo largo
Curitiba - alvaro ramos
Curitiba - anexo
Curitiba - ahú
Curitiba - boqueirão
Curitiba - cic
Curitiba - fazenda pública
Curitiba - f. Cível
Curitiba - f. Cível ii
Curitiba - mateus leme
Curitiba - mauá
Curitiba - je pinheirinho
Curitiba – rua da glória, 290
Curitiba – rua da glória, 362
Curitiba – rua da glória, 393
Curitiba - santa felicidade
Curitiba – vep
Curitiba – técnico residente
Guarapuava
Guaratuba
Lapa
Paranaguá
Paranaguá – jecc
Piraquara
Ponta grossa
Rio negro
São José dos Pinhais, v. Infância e juventude
São José dos Pinhais, v. Fazenda pública
Teixeira soares
União da vitória
União da vitória – v de família

REGIONAL OESTE – UNIDADES ATENDIDAS

Assis chateaubriand
Capanema
Cascavel
Chopinzinho
Coronel vivida
Dois vizinhos
Foz do iguaçu
Francisco beltrão
Laranjeiras do sul
Marechal cândido rondon
Medianeira

Pato branco
Quedas do iguaçu
Santo antônio do sudoeste
São miguel do iguaçu
Toledo

REGIONAL NORTE – UNIDADES ATENDIDAS

Apucarana
Bela vista do paraíso
Cambé
Campo mourão
Cianorte
Congoinhas
Cornélio procópio
Cruzeiro do oeste
Engenheiro beltrão
Ibaiti
Ibiporã
Ivaiporã
Londrina – fórum cível
Londrina - vep
Marialva
Maringá – fórum principal
Maringá – juizado especial
Maringa – fórum novo
Porecatu
Santa fé
Santo antônio da platina
Telêmaco borba
Terra boa
Tibagi

8.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS

PARANÁ TOTAL

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO INDIVIDUAIS** Total: 3947
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Todas as Comarcas do Estado

Split Hi Wall 7.500Btu/h	17
Split Hi Wall 9.000Btu/h	198
Split Hi Wall 12.000Btu/h	322
Split Hi Wall 18.000Btu/h	788
Split Hi Wall 22.000Btu/h	52
Split Hi Wall 24.000Btu/h	521
Split Hi Wall 30.000Btu/h	346
Split Piso-Teto 12.000Btu/h	21
Split Piso-Teto 18.000Btu/h	24
Split Piso-Teto 24.000Btu/h	58
Split Piso-Teto 30.000Btu/h	36

Split Piso-Teto 36.000Btu/h	201
Split Piso-Teto 42.000Btu/h	5
Split Piso-Teto 48.000Btu/h	123
Split Piso-Teto 60.000Btu/h	148
Split Cassete 18.000Btu/h	110
Split Cassete 24.000Btu/h	61
Split Cassete 30.000Btu/h	55
Split Cassete 36.000Btu/h	63
Split Cassete 48.000Btu/h	95
Split Cassete 60.000Btu/h	15
Split Built-in 30.000Btu/h	1
Split Built-in 48.000Btu/h	3
Split Built-in 60.000Btu/h	2
Janeleiro 2.500Btu/h	2
Janeleiro 7.500Btu/h	5
Janeleiro 10.000Btu/h	10
Janeleiro 12.000Btu/h	134
Janeleiro 15.000Btu/h	4
Janeleiro 18.000Btu/h	126
Janeleiro 19.000Btu/h	135
Janeleiro 20.000Btu/h	1
Janeleiro 21.000Btu/h	191
Janeleiro 30.000Btu/h	74
Cortina de Ar	36
Caixas de Ventilação Mecânicas	15

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO CENTRAL**: Total de 28 sistemas
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Curitiba - álvaro ramos
 Curitiba – anexo
 Curitiba – centro judiciário
 Curitiba – champagnat
 Curitiba – mauá
 Curitiba – palácio da justiça
 Curitiba – pinheirinho
 Curitiba – restaurante
 Curitiba – tribunal do júri
 Campo largo
 Guaratuba
 Guarapuava
 Rio negro
 Lapa
 Laranjeiras do sul
 Cascavel
 Coronel vivida
 Formosa do oeste
 Foz do iguaçu
 Pato branco
 Toledo
 Cambé
 Engenheiro beltrão
 Jacarezinho

Paraíso do norte
Santa fé
Terra boa
Marechal cândido rondon

8.3 MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS

PARANÁ TOTAL

LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Curitiba:

Prédio Álvaro Ramos.
Palácio da Justiça.
Palácio da Justiça Anexo.
Sede Mauá.
Fórum da Família, da Criança e do Adolescente.
Fórum Cível II.

Outras Comarcas:

Foz do Iguaçu.
Londrina.
Guarapuava.

8.4 REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS

REGIONAL GUARAPUAVA

Cândido de abreu
Cantagalo
Guarapuava
Irati
Iretama
Ivaiporã
Laranjeiras do sul
Mallet
Manoel ribas
Palmital
Pinhão
Pitanga
Prudentópolis
União da vitória

REGIONAL RMC E LITORAL

Araucária,
Almirante Tamandaré,
Antonina,
Bocaiúva do Sul,

Campina Grande do Sul,
Campo Largo,
Cerro Azul,
Colombo,
Fazenda Rio Grande,
Guaratuba,
Matinhos,
Morretes,
Paranaguá,
Pinhais,
Piraquara,
Pontal do Paraná,
Rio Branco do Sul,
São José dos Pinhais.

REGIONAL DE CASCAVEL

Assis chateaubriand
Campina da lagoa
Capanema
Capitão leônidas marques
Cascavel
Catanduvas
Corbélia
Formosa do oeste
Foz do iguaçu
Guaraniaçu
Mamborê
Marechal cândido rondon
Matelândia
Medianeira
Nova aurora
Palotina
Quedas do iguaçu
Santa helena
São miguel do iguaçu
Toledo
Ubiratã

REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Ampére
Barracão
Chopinzinho
Clevelandia
Coronel vivida
Dois vizinhos
Francisco beltrão
Mangueirinha
Marmeleiro
Palmas
Pato branco
Realeza
Salto do lontra

Santo antônio do sudoeste
São João

REGIONAL DE LONDRINA

Apucarana,
Arapongas
Assaí
Bela Vista do Paraíso
Cambé
Congonhinhas
Faxinal
Grandes Rios
Ibiporã
Londrina
Marilândia do Sul
Ortigueira
Primeiro de Maio
Rolândia
São Jerônimo da Serra
Sertanópolis
Uraí.

8.5 MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS

Relação das unidades do contrato e respectivas Regionais (Sedes)

Unidade	Sede	Regional
Curitiba	Augusto Severo	I
Curitiba	Palácio da Justiça	I
Curitiba	Mauá	I
Curitiba	Centro Judiciário Ahú	I
Curitiba	Barracão	I
Ponta Grossa (Ponta Grossa)	Fórum da Comarca de Ponta Grossa	II
Ponta Grossa (União da Vitória)	Fórum da Família e da Infância e Juventude	II
Guarapuava (Guarapuava)	Comarca de Guarapuava	III
Guarapuava (Guarapuava)	Comarca de Guarapuava	III
Francisco Beltrão (Pato Branco)	Comarca de Pato Branco	IV
Francisco Beltrão (Pato Branco)	Comarca de Pato Branco	IV
Londrina (Londrina)	Fórum Cível da Comarca de Londrina	IX
Londrina (Londrina)	Fórum Cível da Comarca de Londrina	IX
Londrina (Londrina)	Fórum Cível da Comarca de Londrina	IX
Cascavel (Foz do Iguaçu)	Comarca de Foz do Iguaçu	V
Cascavel (Cascavel)	Comarca de Cascavel	V
Cascavel (Cascavel)	Comarca de Cascavel	V
Campo Mourão (Campo Mourão)	Comarca de Campo Mourão	VI
Umuarama (Cruzeiro do Oeste)	Comarca de Cruzeiro do Oeste	VII
Umuarama (Cruzeiro do Oeste)	Comarca de Cruzeiro do Oeste	VII
Maringá (Maringá)	Comarca de Maringá	VIII
Maringá (Maringá)	Comarca de Maringá	VIII

Maringá (Maringá)	Comarca de Maringá	VIII
Santo Antônio da Platina	Comarca de Ribeirão Claro	X
Santo Antônio da Platina	Comarca de Cornélio Procópio	X
Telêmaco Borba	Comarca de Telêmaco Borba	XI

Comarcas atendidas por Regional (Sede)

REGIONAL CURITIBA	UNIDADE
ALMIRANTE TAMANDARÉ	Fórum local
ANTONINA	Fórum local
ARAUCÁRIA	Fórum local
BOCAIÚVA DO SUL	Fórum local
CAMPINA GRANDE DO SUL	Fórum local
CAMPO LARGO	Fórum local
CERRO AZUL	Fórum local
COLOMBO	Fórum Central
COLOMBO	Juizados Especiais
COLOMBO	Arquivos gerais
COLOMBO	Fórum Cível
COLOMBO	Fórum da Família
COLOMBO	Arquivos
CURITIBA	Sede Álvaro Ramos
CURITIBA	Sede casa Álvaro Ramos 1
CURITIBA	Sede casa Álvaro Ramos 2
CURITIBA	Barracão Anita Garibaldi
CURITIBA	Sede Arquivo Pinhais
CURITIBA	Sede Arquivo São José dos
CURITIBA	Barracão Flávio Dallegrove
CURITIBA	Sede Lysimaco Ferreira da
CURITIBA	Centro de Educação Infantil
CURITIBA	Cetrans
CURITIBA	Cetrans - DETO
CURITIBA	Centro Judiciário de Curitiba
CURITIBA	Sede Cândido de Abreu
CURITIBA	Sede Pery Moreira
CURITIBA	Sede Rua da Glória 1
CURITIBA	Sede Rua da Glória 2
CURITIBA	Sede Rua da Glória 3
CURITIBA	Sede Nilo Peçanha
CURITIBA	Sede Ivo Leão
CURITIBA	Escola da Magistratura
CURITIBA	Fórum Cível 1 (Cândido de
CURITIBA	Fórum Cível 2 (Mateus
CURITIBA	Sede Mauá
CURITIBA	Sede Mauá 2 (Augusto
CURITIBA	Fórum Descentralizado do
CURITIBA	Fórum Descentralizado de

CURITIBA	Fórum Descentralizado do
CURITIBA	Fórum Descentralizado do
CURITIBA	Fórum Descentralizado do
CURITIBA	Sede Mateus Leme
CURITIBA	Complexo do Palácio da
CURITIBA	Tribunal do Júri
CURITIBA	Sede Avenida Iguaçu
CURITIBA	Vara de Adolescentes
CURITIBA	Vara de Execuções Penais
FAZENDA RIO GRANDE	Fórum local
FAZENDA RIO GRANDE	Juizados Especiais
GUARATUBA	Fórum local
LAPA	Fórum local
MATINHOS	Fórum local
MORRETES	Fórum local
PARANAGUÁ	Fórum Central
PARANAGUÁ	Fórum Cível
PARANAGUÁ	Juizados Especiais
PARANAGUÁ	Arquivos gerais
PINHAIS	Fórum local
PIRAQUARA	Fórum Central
PIRAQUARA	Fórum Cível e Família
PONTAL DO PARANÁ	Fórum local
RIO BRANCO DO SUL	Fórum local
RIO NEGRO	Fórum local
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Fórum Central
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Fórum da Família
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Juizados Especiais
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Fórum da Fazenda Pública

SEDE PONTA GROSSA	UNIDADE
CASTRO	Fórum local
IMBITUVA	Fórum local
IPIRANGA	Fórum local
JAGUARIAÍVA	Fórum local
PALMEIRA	Fórum local
PIRAÍ DO SUL	Fórum local
PONTA GROSSA	Fórum central
PONTA GROSSA	Sede Cejusc e arquivos
SENGÉS	Fórum local

SEDE UNIÃO DA VITÓRIA	UNIDADE
IRATI	Fórum local
IRATI	Juizados Especiais
MALLET	Fórum local
REBOUÇAS	Fórum local
SÃO JOÃO DO TRIUNFO	Fórum local

SÃO MATEUS DO SUL	Fórum local
TEIXEIRA SOARES	Fórum local
UNIÃO DA VITÓRIA	Fórum central
UNIÃO DA VITÓRIA	Arquivos 1
UNIÃO DA VITÓRIA	Arquivos 2
UNIÃO DA VITÓRIA	Fórum da Família

SEDE TELÊMACO BORBA	UNIDADE
ARAPOTI	Fórum local
CÂNDIDO DE ABREU	Fórum local
CONGONHINHAS	Fórum local
CURIÚVA	Fórum local
IBAITI	Fórum local
ORTIGUEIRA	Fórum local
RESERVA	Fórum local
SÃO JERÔNIMO DA SERRA	Fórum local
TELÊMACO BORBA	Fórum central
TELÊMACO BORBA	Fórum da Família
TIBAGI	Fórum local

SEDE RIBEIRÃO CLARO	UNIDADE
CARLÓPOLIS	Fórum local
JACAREZINHO	Fórum local
JOAQUIM TÁVORA	Fórum local
RIBEIRÃO CLARO	Fórum local
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	Fórum local
SIQUEIRA CAMPOS	Fórum local
TOMAZINA	Fórum local
WENCESLAU BRAZ	Fórum local

SEDE CORNÉLIO PROCÓPIO	UNIDADE
ANDIRÁ	Fórum local
BANDEIRANTES	Fórum local
CAMBARÁ	Fórum local
CORNÉLIO PROCÓPIO	Fórum local
CORNÉLIO PROCÓPIO	Juizados Especiais
NOVA FÁTIMA	Fórum local
RIBEIRÃO DO PINHAL	Fórum local
SANTA MARIANA	Fórum local

SEDE LONDRINA	UNIDADE
APUCARANA	Fórum local
ARAPONGAS	Fórum local
ASSAÍ	Fórum local
BELA VISTA DO PARAÍSO	Fórum local

CAMBÉ	Fórum local
FAXINAL	Fórum local
GRANDES RIOS	Fórum local
GRANDES RIOS	Arquivos gerais
IBIPORÃ	Fórum local
JAGUAPITÃ	Fórum local
LONDRINA	Fórum local
LONDRINA	Fórum Criminal
MARILÂNDIA DO SUL	Fórum local
PORECATÚ	Fórum local
PRIMEIRO DE MAIO	Fórum local
PRIMEIRO DE MAIO	Uso geral forense
ROLÂNDIA	Fórum local
SERTANÓPOLIS	Fórum local
URAI	Fórum local

SEDE MARINGÁ	UNIDADE
ALTO PARANÁ	Fórum local
ASTORGA	Fórum local
CENTENÁRIO DO SUL	Fórum local
COLORADO	Fórum local
JANDAIA DO SUL	Fórum local
LOANDA	Fórum local
MANDAGUAÇÚ	Fórum local
MANDAGUARÍ	Fórum local
MARIALVA	Fórum local
MARIALVA	Uso geral forense
MARINGÁ	Fórum local
MARINGÁ	Arquivos gerais
MARINGÁ	Arquivos
MARINGÁ	Fórum Cível
MARINGÁ	Juizados Especiais
NOVA ESPERANÇA	Fórum local
NOVA LONDRINA	Fórum local
PARANACITY	Fórum local
PARANAVAÍ	Fórum local
SANTA FÉ	Fórum local
SARANDI	Fórum local
TERRA RICA	Fórum local

SEDE CRUZEIRO DO OESTE	UNIDADE
ALTO PIQUIRI	Fórum local
ALTÔNIA	Fórum local
ASSIS CHATEAUBRIAND	Fórum local
CIDADE GAÚCHA	Fórum local

CRUZEIRO DO OESTE	Fórum local
FORMOSA DO OESTE	Fórum local
GOIOERÊ	Fórum local
GUAÍRA	Fórum local
ICARAÍMA	Fórum local
IPORÃ	Fórum local
PALOTINA	Fórum local
PARAÍSO DO NORTE	Fórum local
PÉROLA	Fórum local
SANTA ISABEL DO IVAÍ	Fórum local
TERRA ROXA	Fórum local
UMUARAMA	Fórum local
XAMBRÊ	Fórum local

SEDE CAMPO MOURÃO	UNIDADE
BARBOSA FERRAZ	Fórum local
CAMPINA DA LAGOA	Fórum local
CAMPO MOURÃO	Fórum local
CIANORTE	Fórum local
CIANORTE	Juizados Especiais
ENGENHEIRO BELTRÃO	Fórum local
IRETAMA	Fórum local
IVAIPORÃ	Fórum local
MAMBORÊ	Fórum local
PEABIRÚ	Fórum local
SÃO JOÃO DO IVAÍ	Fórum local
TERRA BOA	Fórum local
UBIRATÃ	Fórum local

SEDE CASCAVEL	UNIDADE
CAPANEMA	Fórum local
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	Fórum local
CASCAVEL	Fórum local
CATANDUVAS	Fórum local
CORBÉLIA	Fórum local
GUARANIAÇÚ	Fórum local
MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Fórum local
MATELÂNDIA	Fórum local
NOVA AURORA	Fórum local
QUEDAS DO IGUAÇÚ	Fórum local
SANTA HELENA	Fórum local
TOLEDO	Fórum local

SEDE FOZ DO IGUAÇU	UNIDADE
FOZ DO IGUAÇU	Fórum local

MEDIANEIRA	Fórum local
SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ	Fórum local

SEDE PATO BRANCO	UNIDADE
AMPÉRE	Fórum local
BARRAÇÃO	Fórum local
CHOPINZINHO	Fórum local
CLEVELÂNDIA	Fórum local
CORONEL VIVIDA	Fórum local
DOIS VIZINHOS	Fórum local
FRANCISCO BELTRÃO	Fórum local
MANGUEIRINHA	Fórum local
MARMELEIRO	Fórum local
PALMAS	Fórum local
PATO BRANCO	Fórum local
REALEZA	Fórum local
SALTO DO LONTRA	Fórum local
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE	Fórum local
SÃO JOÃO	Fórum local

SEDE GUARAPUAVA	UNIDADE
CANTAGALO	Fórum local
GUARAPUAVA	Fórum local
LARANJEIRAS DO SUL	Fórum local
MANOEL RIBAS	Fórum local
PALMITAL	Fórum local
PINHÃO	Fórum local
PITANGA	Fórum local
PRUDENTÓPOLIS	Fórum local
PRUDENTÓPOLIS	Arquivos gerais
